

Föderale Digitalisierungsprojekte

Controllingbericht

09.05.2023 | AL-Runde | Jörg Kremer

Projektübersicht: Darstellung der Projektarten

Föderale Digitalisierungsprojekte



Neue Projekte:

In der AL-Runde vom 6. Dezember 2022 wurden anhand der Auswertung von eingereichten Steckbriefen Projekte vorbehaltlich angenommen. Ein Überblick über den aktuellen Status dieser Projekte wird ab S. 3 gegeben.



Aktive Projekte:


Laufende Projekte, die zum 13. April 2023 turnusgemäß einen Controllingbericht eingereicht haben. Eine Auswertung ist den S. 7-15 zu entnehmen.



Projekte im Abschluss:

Projekte, die zuletzt abgeschlossen wurden und einen Abschlussbericht eingesendet haben. Der eingegangene Projektabschluss wird auf S. 17 dargestellt.

Projekte je Phase



■ Neue Projekte

■ Aktive Projekte

■ Projekte im Abschluss

Neue Projekte



Projektübersicht: Eingang vollständiger Projektplanungen

Projekt-ID	Projektname	Eingereicht	Angenommen
itPLR-21-009	EfA-Nachnutzung govdigital Marktplatz – Betrieb und Weiterentwicklung*	✓	●
itPLR-21-013	XÖV-Suite (ehem. xdomea Werkzeug zur Profilierung und Visualisierung)*	✓	●
itPLR-22-003	EfA Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung*	✓	●
itPLR-22-016	Open Source Werkzeug für XÖV*	✓	●
itPLR-22-021	XRepository - Sicherheit und Qualitätssicherung	✓	●
itPLR-22-022	Berufliche Bildung - Zusammenarbeitsstrukturen mit Kammern	✓	●
itPLR-22-024	MODUL-F @Kommunen	✓	●
itPLR-22-025	TF Gesundheit - Teilhabe am Arbeitsleben	✓	●
itPLR-22-027	Innovative Weiterbildungskonzepte - Kompetenz-Turbo	✓	●
itPLR-22-028	KollOM-FIT Kollobaratives Ontologiemanagement für die föderale IT	✓	●
itPLR-22-034	Weiterführung der Container- und Cloud-Strategie der Anwendung Governikus	✓	●
itPLR-22-035	Weiterentwicklung ID Crucis	✓	●

* Projekt wurde bereits vor 2023 begonnen (Mehrbedarf/Laufzeitverlängerung wurde über das Steckbriefformular gemeldet) und ist daher ebenfalls unter den bereits laufenden Projekten (untenstehend) aufgeführt.

Neue Projekte




Projektübersicht: Eingang vollständiger Projektplanungen

Projekt-ID	Projektname	Eingereicht	Angenommen
itPLR-22-036	Umsetzung Sorgeregister - Referenzimplementierung Landessorgeregister in der FHB	✓	●
itPLR-22-037	Stärkung der XTA/OSCI-Infrastrukturen	✓	●
itPLR-22-038	RegCheck - Rolloutverprobung am Beispiel IDNr Melderegister	✓	●
itPLR-22-039	Qualitätsprojekt Q vormals Qualitätsoffensive	✗	●
itPLR-22-040	Optimierung Standardisierungsagenda	✓	●
itPLR-22-060	Nachnutzung MVP EfA Parametrisierung*	✓	●
itPLR-22-061	Zukunftstechnologie für 115 und OZG 2.0	✓	●
itPLR-22-062	Erweiterter Gehaltsdatenabruf	✓	●
itPLR-22-064	Geothermie-Akten in der Wasserbehörde (Bohrlochphysik)	✓	●
itPLR-22-066	Pilotierung und Rollout einer Standardschnittstelle zur Anbindung von Bezahldiensten (XBezahldienste)	✓	●
itPLR-22-067	Kooperationsprojekt Digitalisierung der Beschaffung (RLP, HB, NRW, BMI)*	✓	●

* Projekt wurde bereits vor 2023 begonnen (Mehrbedarf/Laufzeitverlängerung wurde über das Steckbriefformular gemeldet) und ist daher ebenfalls unter den aktiven Projekten (S. 7/8) aufgeführt.

Neue Projekte



Durch FITKO mit roter Ampel bewertetes Projekt

Qualitätsprojekt Q vormals Qualitätsoffensive (itPLR-22-039), Eigentümer: FITKO

Begründung für rote Ampel: Projektantrag wurde nicht eingereicht.

Handlungs- und Beschlussempfehlungen

Alternative A) FITKO prüft, ob und mit welcher Perspektive das Projekt weitergeführt werden soll und berichtet der Abteilungsleiterrunde in der kommenden Sitzung.

Alternative B) Das Projekt wird gestoppt, die Projektmittel (1,55 Mio. Euro) stehen für andere/neue Projekte zur Verfügung.

Projektübersicht: Darstellung der Projektarten

Föderale Digitalisierungsprojekte



Neue Projekte:

In der AL-Runde vom 6. Dezember 2022 wurden anhand der Auswertung von eingereichten Steckbriefen Projekte vorbehaltlich angenommen. Ein Überblick über den aktuellen Status dieser Projekte wird ab S. 3 gegeben.



Aktive Projekte:

Laufende Projekte, die zum 13. April 2023 turnusgemäß einen Controllingbericht eingereicht haben. Eine Auswertung ist den S. 7-15 zu entnehmen.



Projekte im Abschluss:

Projekte, die zuletzt abgeschlossen wurden und einen Abschlussbericht eingesendet haben. Der eingegangene Projektabschluss wird auf S. 17 dargestellt.

Projekte je Phase




■ Neue Projekte

■ Aktive Projekte

■ Projekte im Abschluss


Aktive Projekte



Vor dem Jahr 2023 begonnene föderale Digitalisierungsprojekte

Projekt-ID	Projektname	Ampel
itPLR-20-006	Aufbau einer Bildungs- und Weiterbildungsplattform eGovernment (eGov-Campus)	●
itPLR-20-016	Aufbau eines föderalen IT-Architekturmanagements	●
itPLR-20-039	Föderales Informationsmanagement (FIM) Datenfelder	●
itPLR-20-042	Föderales Informationsmanagement (FIM) Bausteinharmonisierung (ehem. Gesamtarchitektur)	●
itPLR-20-045	EfA Bergbau	●
itPLR-21-008	EfA-Umsetzung der OZG-Leistung „Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit“	●
itPLR-21-009	EfA-Nachnutzung govdigital Marktplatz – Betrieb und Weiterentwicklung	●
itPLR-21-012	Ausbau der Multikanal-Kommunikationsplattform des IT-PLR	●
itPLR-21-013	Xdomea Werkzeug zur Profilierung und Visualisierung	●

Aktive Projekte



Vor dem Jahr 2023 begonnene föderale Digitalisierungsprojekte

Projekt-ID	Projektname	Ampel
itPLR-22-001	Erarbeitung von diversen Kommunikations- und Marketingstrategien	●
itPLR-22-003	EfA Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung	●
itPLR-22-008	Anbindung des Handelsregisters an das WSP NRW	●
itPLR-22-009	115 als zentrale Supportkomponente	●
itPLR-22-016	Open Source Werkzeug für XÖV	●
itPLR-22-060	Nachnutzung MVP EfA-Parametrisierung (freiwilliger Bericht)	●


Aktive Projekte



Auswertung laufende Projekte auf Ebene Projektportfolio

Projektstatus


Status Bewertung FITKO




9 von 15 Projekten im Portfolio (60%) werden in Summe der ausgewerteten Daten mit einer gelben oder roten Ampel bewertet.

Fortschritt (Finanzen)

Finanzen zum Berichtszeitpunkt




Finanzen gesamt



Im Durchschnitt liegt der Mittelverbrauch der Projekte zum Berichtszeitpunkt knapp unter Plan. Die Prognose auf das Gesamtbudget liegt 16% unter Plan.

Risiko


Gemeldete Risiken



Die Projekte im Portfolio haben in der Summe eine hohe Anzahl an mittleren bis hohen Risiken gemeldet.

Fortschritt (Zeit)

Übersicht Meilenstein-Erreichung



Im Verhältnis zur ursprünglich geplanten Projektlaufzeit (Ende 2022) sind nach erfolgten Projektüberplanungen noch knapp die Hälfte der Meilensteine offen.

Aktive Projekte



Durch FITKO mit roter Ampel bewertetes Projekt

Anbindung des Handelsregisters an das WSP NRW (itPLR-22-008)

Begründung für rote Ampel: Das Projekt hat keinen Quartalsbericht eingereicht. Eine begleitende Prüfung und die Freigabe für das kommende Quartal war somit nicht möglich.

Handlungs- und Beschlussempfehlungen

FITKO intensiviert die Kommunikation mit dem Projekt und fordert diverse Dokumente (u.a. Rechnungen) ein, um den Projektstand nachvollziehen zu können.

Aktive Projekte



Durch FITKO mit roter Ampel bewertetes Projekt

Föderales Informationsmanagement (FIM) Datenfelder (itPLR-20-039), Eigentümer: FITKO

Begründung für rote Ampel: Projekt ist nicht prüfbar:

- Quartalsbericht enthielt (wie auch in Q4 22) keine Daten zu Meilensteinen und Risiken
- kein Projektfortschritt in Q1 berichtet/erkennbar
- Finanzen in Q1 zur Abwicklung des Projekts vorgesehen
- Projektabschluss voraussichtlich ohne Zielerreichung

Handlungs- und Beschlussempfehlungen

Das Projekt wird um einen Sachstandsbericht sowie um eine valide Projektplanung gebeten. FITKO wird berichten, sobald diese Dokumente vorliegen (spätestens in der Abteilungsleiterrunde am 3. Juli 2023).

Aktive Projekte



Durch FITKO mit roter Ampel bewertetes Projekt

Föderales Informationsmanagement (FIM) Bausteinharmonisierung (itPLR-20-042), Eigentümer: FITKO

Begründung für rote Ampel: Selbstbewertung des Projektes aufgrund von Terminverschiebungen. Diese sind durch die Entscheidung entstanden, nicht das Angebot des IT-Dienstleisters des Bausteins FIM-Datenfelder für die Realisierung des Sammelrepositorys zu nutzen, sondern eine Eigenentwicklung zu beauftragen, die aus einem Rahmenvertrag abgerufen wird.

Handlungs- und Beschlussempfehlungen

Enge Begleitung des Projektes durch FITKO, um das Projektziel im Rahmen der vorgenommenen Umplanungen zeitverzögert Ende 2024 zu erreichen.

Aktive Projekte



Durch FITKO mit roter Ampel bewertetes Projekt

Nachnutzung MVP EfA-Parametrisierung (itPLR-22-060), Eigentümer: FITKO

Begründung für rote Ampel: Zentrales Risiko ist eingetreten

- Einreichung einer Beschlussvorlage für die XZuFi-Weiterentwicklung seitens der Projekts EfA-Parametrisierung in der 22. FIM-FG-Sitzung
- Ablehnung des Beschlussvorschlags
- dadurch Nicht-Berücksichtigung des Szenarios in der Weiterentwicklung des XZuFi

Handlungs- und Beschlussempfehlungen

Alternative A) Der Herausgeber des Standards XZuFi wird geändert: von GK FIM auf FITKO.


Alternative B) Aufgrund des eingetretenen Risikos und der nicht kalkulierbaren weiteren zeitlichen Verzögerung wird das Projekt beendet.

Aktive Projekte



Bericht zu Projekt-Status EfA-Parametrisierung

Zeitschiene der Umsetzung der EfA-Parametrisierung:

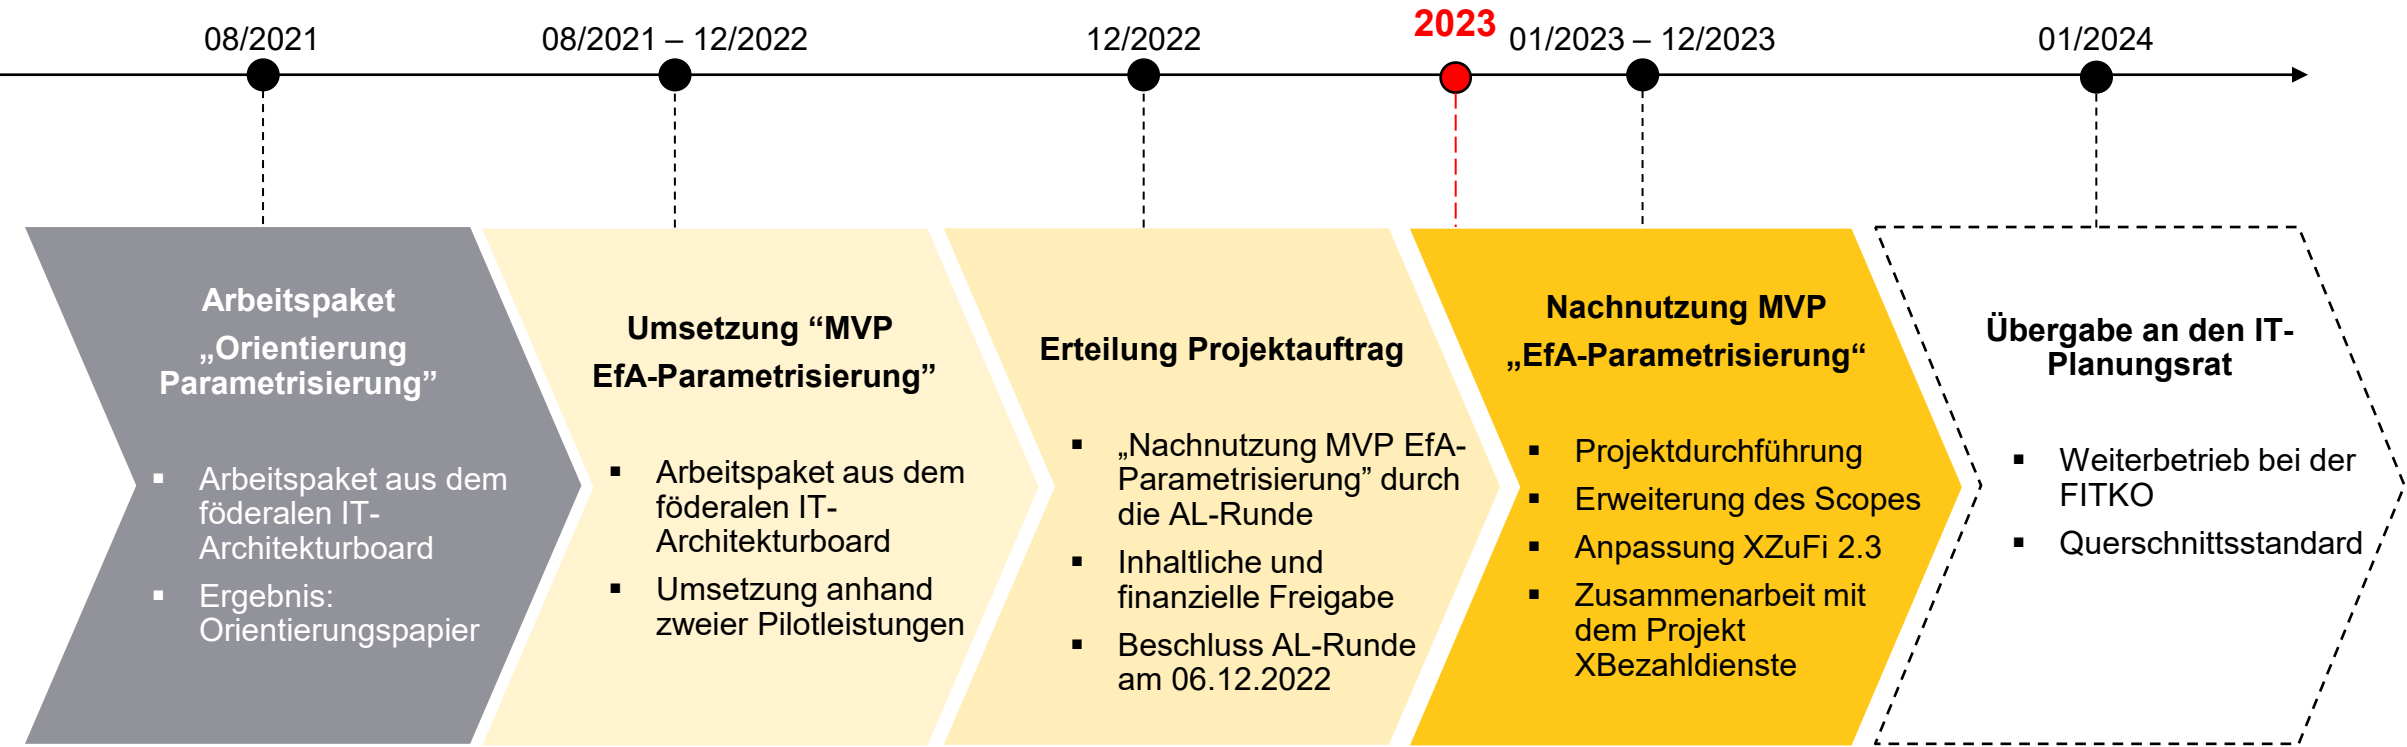


AL-Runde 09.05.2023 Föderale Digitalisierungsprojekte

Aktive Projekte



Bericht zu Projekt-Status EfA-Parametrisierung

Verlauf des Projekts der EfA-Parametrisierung in Bezug auf die XZuFi Weiterentwicklung:

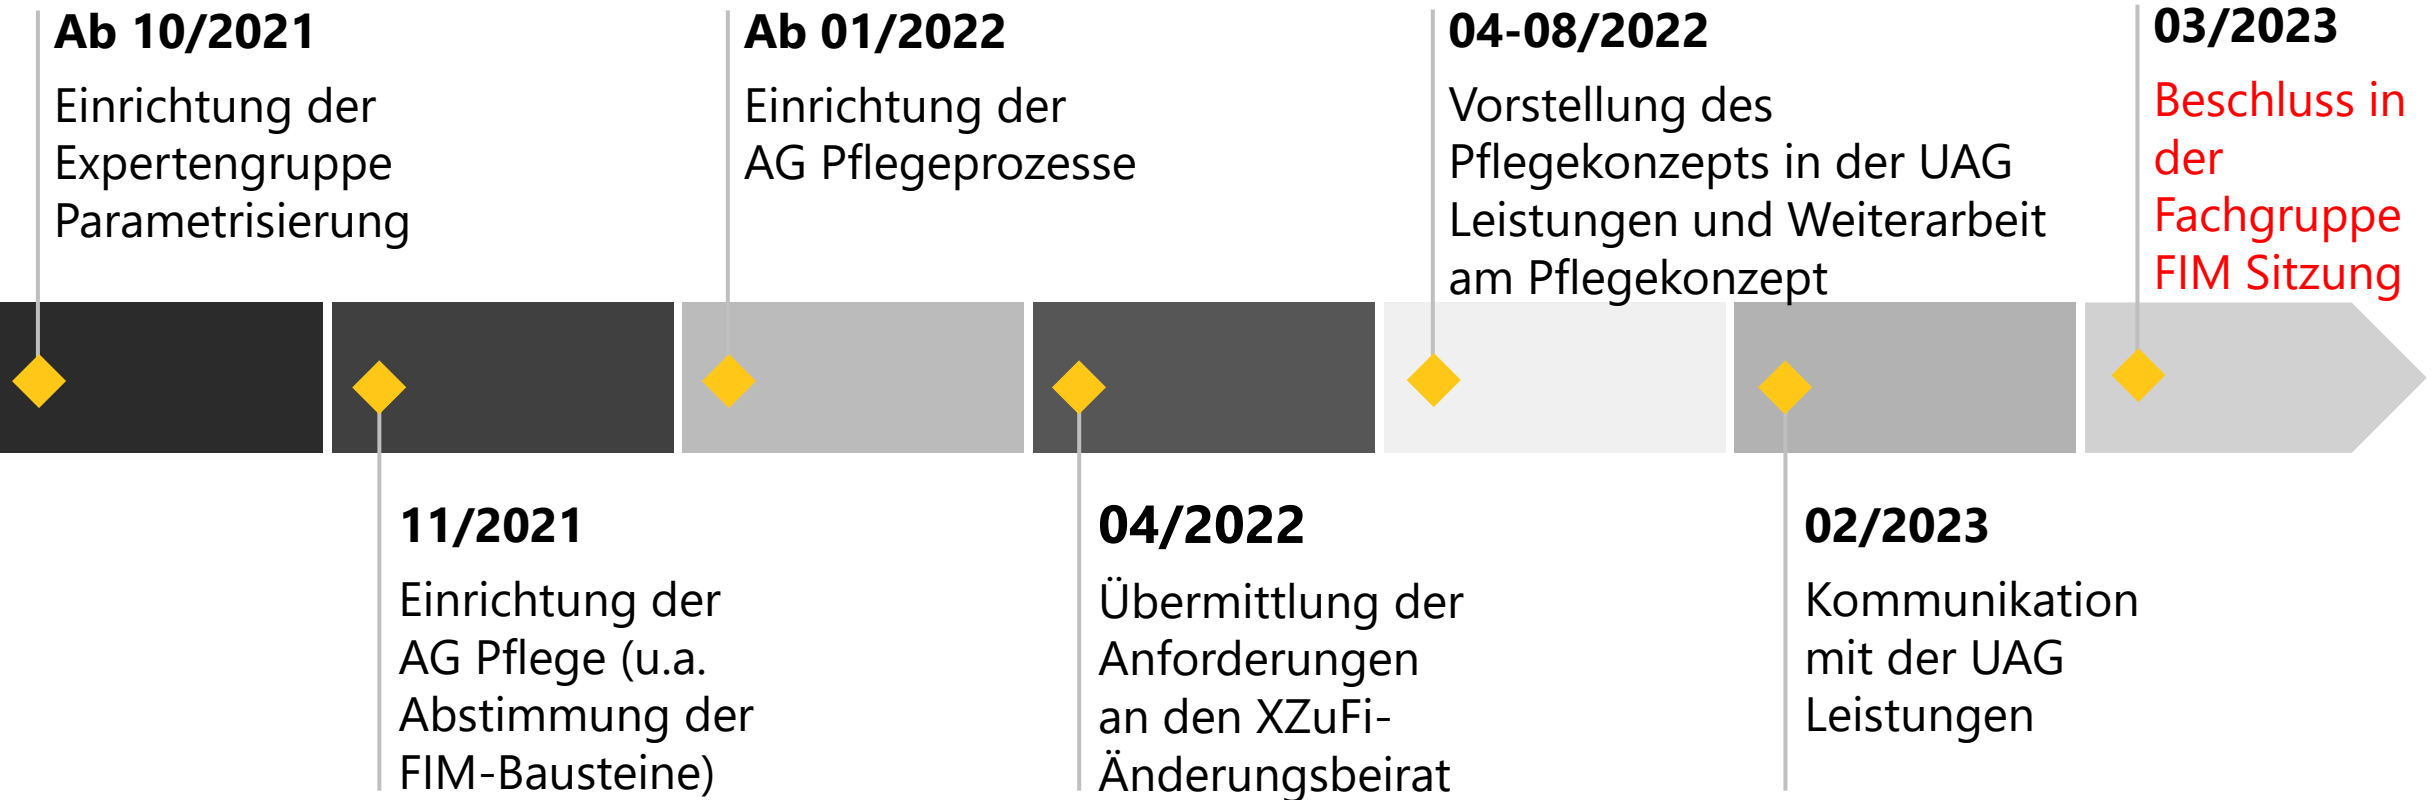

Projektübersicht: Darstellung der Projektarten

Föderale Digitalisierungsprojekte



Neue Projekte:

In der AL-Runde vom 6. Dezember 2022 wurden anhand der Auswertung von eingereichten Steckbriefen Projekte vorbehaltlich angenommen. Ein Überblick über den aktuellen Status dieser Projekte wird ab S. 3 gegeben.



Aktive Projekte:

Laufende Projekte, die zum 13. April 2023 turnusgemäß einen Controllingbericht eingereicht haben. Eine Auswertung ist den S. 7-15 zu entnehmen.



Projekte im Abschluss:

Projekte, die zuletzt abgeschlossen wurden und einen Abschlussbericht eingesendet haben. Der eingegangene Projektabschluss wird auf S. 17 dargestellt.

Projekte je Phase

23

15


1

■ Neue Projekte




■ Aktive Projekte

■ Projekte im Abschluss

○ Auswertung Projekt(e) im Abschluss



Kleinteilige Beschaffung KleBe.digital (itPLR-21-002)

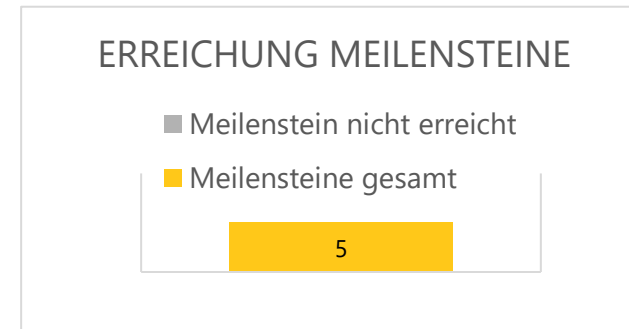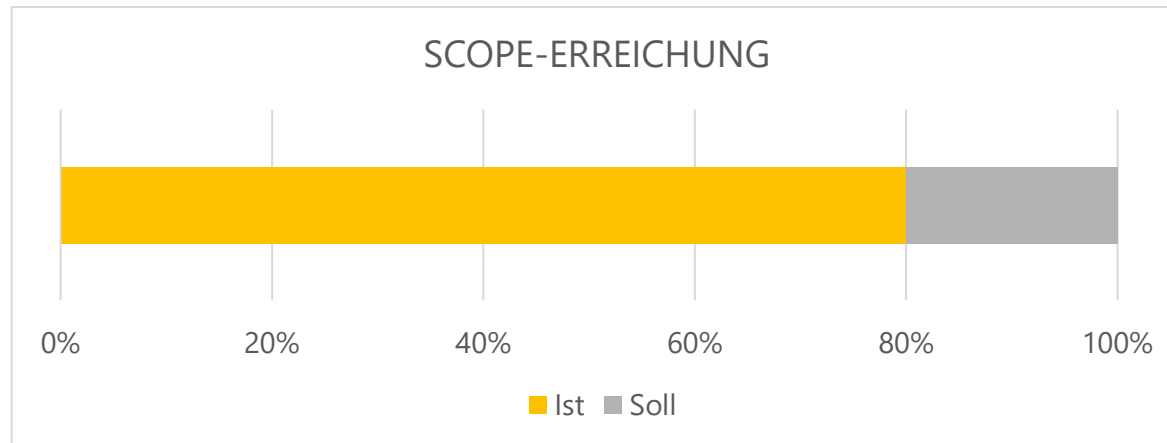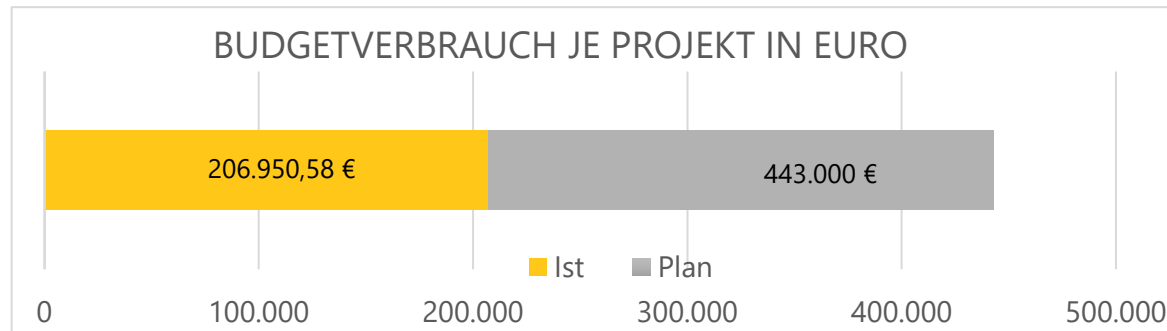


✓ Projekt wurde fristgerecht abgeschlossen

Das Projekt KleBe.digital wurde zu Ende des Jahres 2022 abgeschlossen.

Die Budgetabweichung resultiert aus dem verspäteten Projektstart und der anfänglich geringeren Personalbesetzung.


Inhaltlich wurden alle Ziele erreicht, jedoch konnte die produktive Pilotierung mit Lieferanten nicht vollständig abgeschlossen werden. Diese soll in einem Folgeprojekt in 2023 fortgeführt werden.

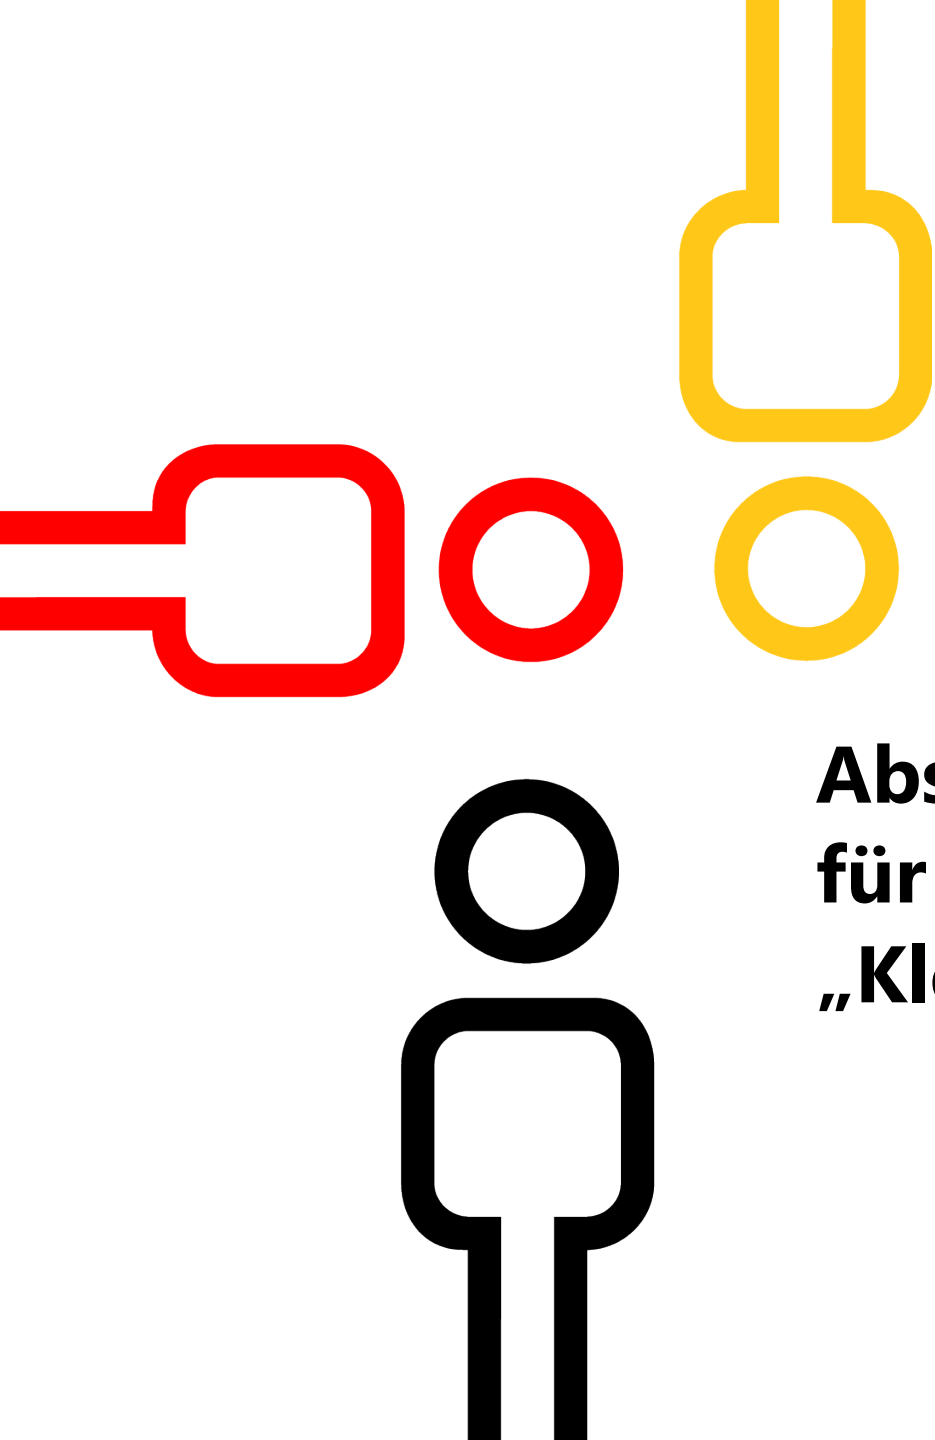

**Abschlussbericht Detailfolien
für das Projekt
„Kleinteilige Beschaffung“**

Ursprüngliche Projektziele

- Analyse der Grenzen herkömmlicher Standardisierungsbestrebungen

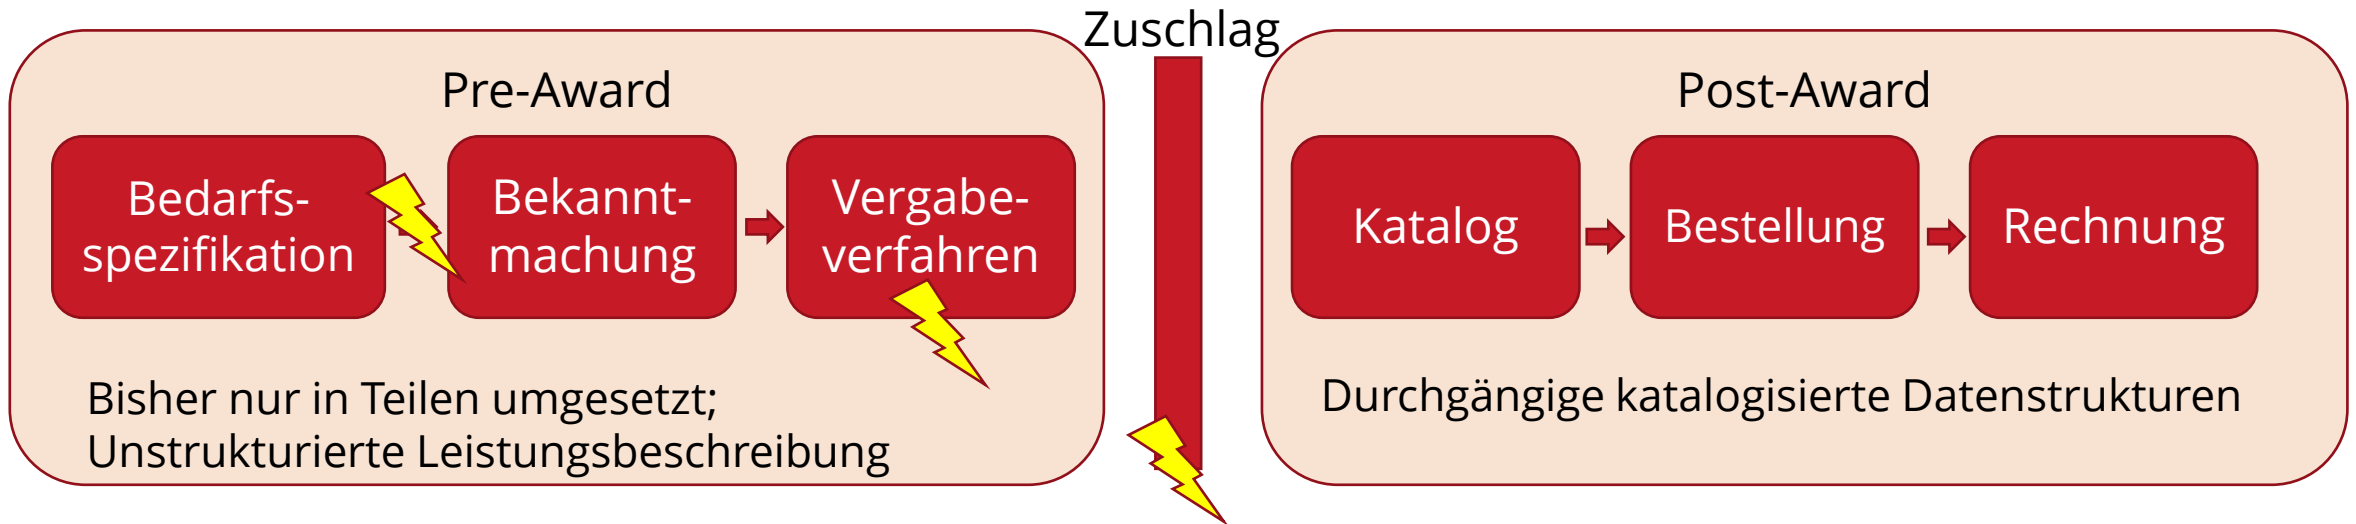


■ **EINSCHRÄNKUNGEN**

- Die Bedarfsspezifikation liegt in keiner einheitlich strukturierten Form vor
- Vergabestellen und Lieferanten müssen ähnliche Vergabedokumente wiederholt erstellen und verwalten
- Unklarer Handshake zwischen Pre- und Post-Award: Unstrukturierte Vergabedokumente müssen nach Zuschlag zu strukturiertem Post-Award Katalog transformiert werden

Ursprüngliche Projektziele

- Aufhebung der Grenzen herkömmlicher Standardisierungsbestrebungen: Lösungsansatz

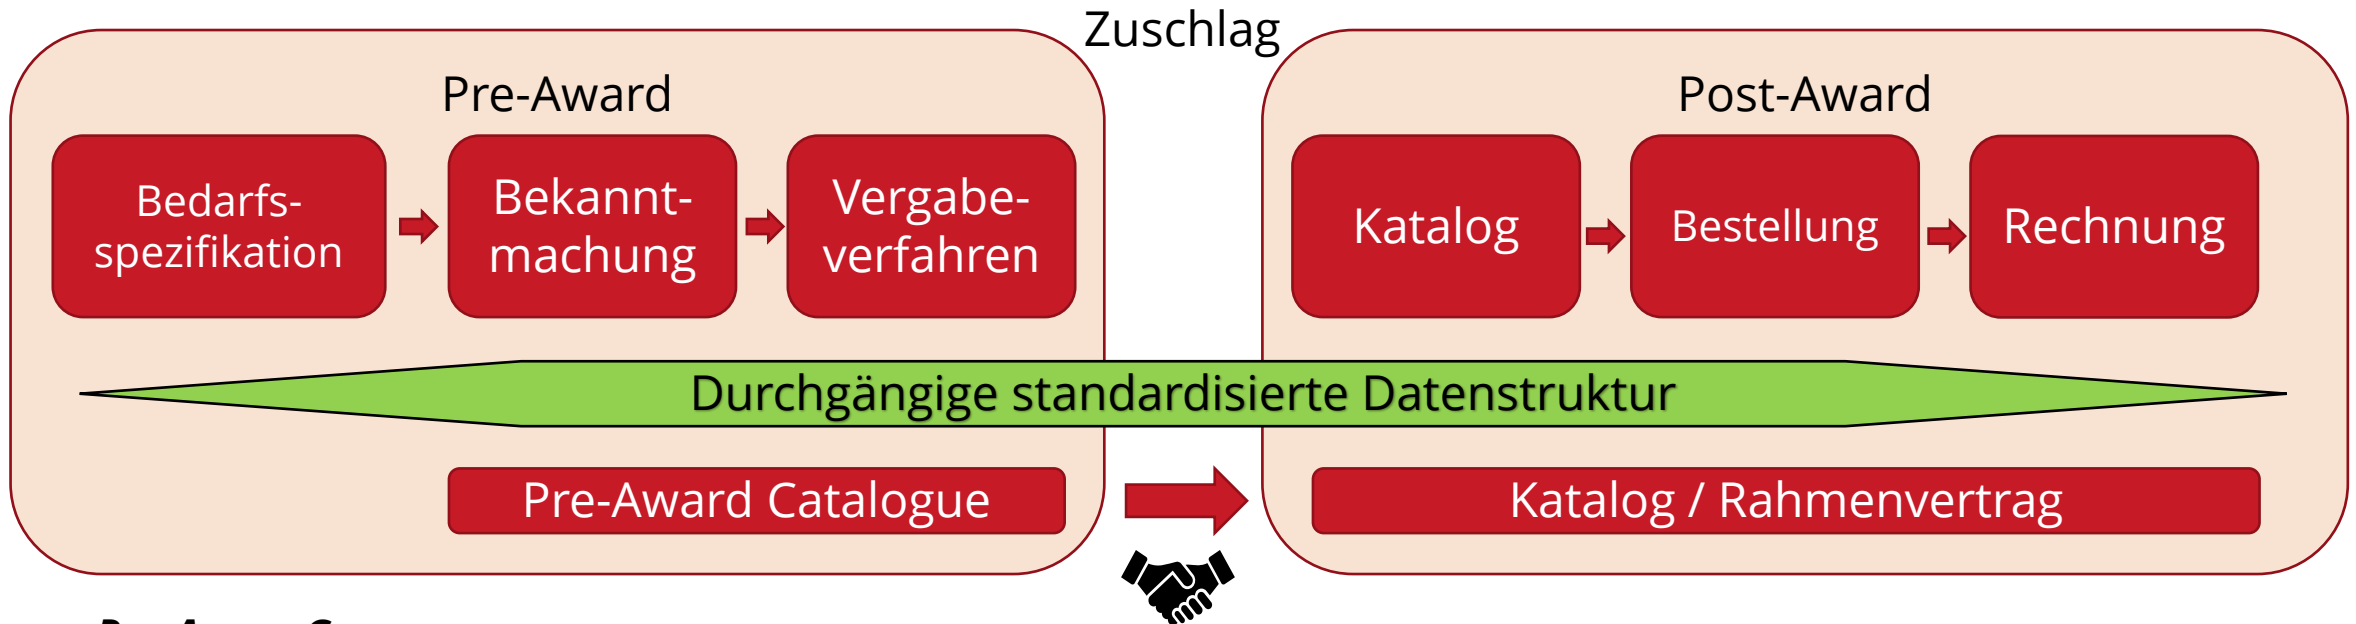


■ **PRE-AWARD CATALOGUE**

- Vergabestelle erstellt anonyme Anfrage bereits in standardisiertem Katalogformat
- Bieter antworten mit ausgefülltem Katalog
- Nach Zuschlag kann dieser Katalog ohne zusätzlichen Aufwand in einen Rahmenkatalog umgewandelt werden

Architektur pACT - v1.2

■ Gesamtübersicht Pre-Award Katalog (pACT)

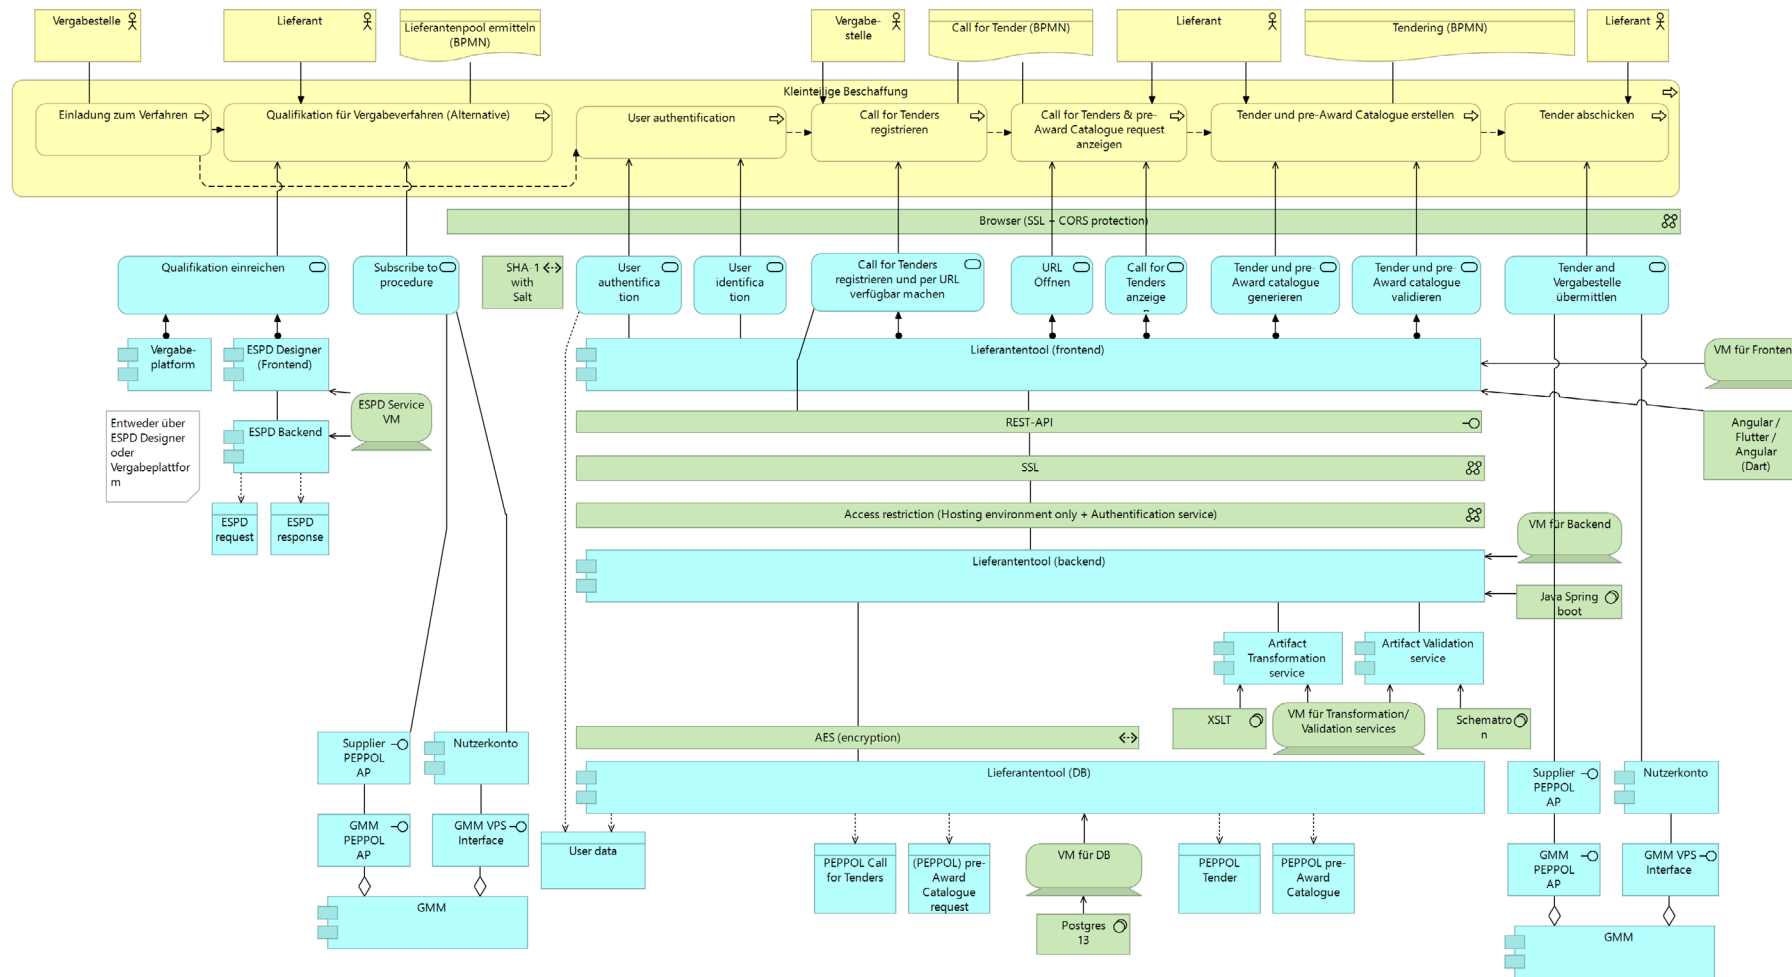

Legende: ArchiMate Notation

Prozesssicht

Anwendungssicht

Technologiesicht


Pilotierung



LANDESBETRIEB
MOBILITÄT
RHEINLAND-PFALZ




- Übersicht zum durchgängigen Pilotierungsprozess: BPMN Kollaborationsmodell (vergrößert auf den nächsten Folien)

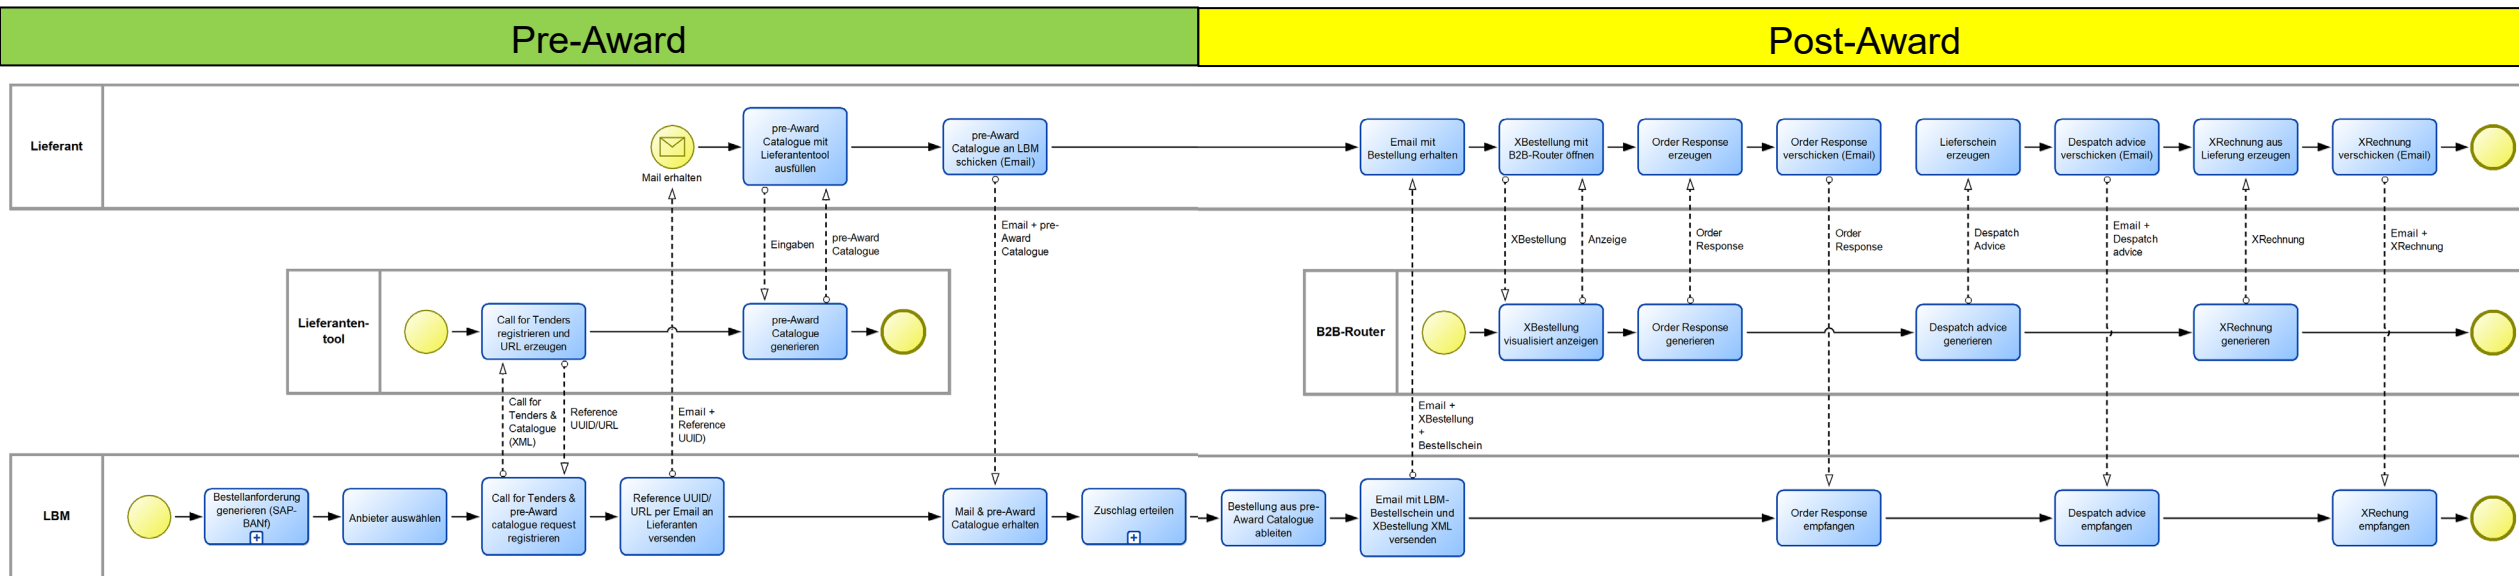

Pilotierung Pre-Award

- Pilotierungsprozess Pre-Award: BPMN Kollaborationsmodell

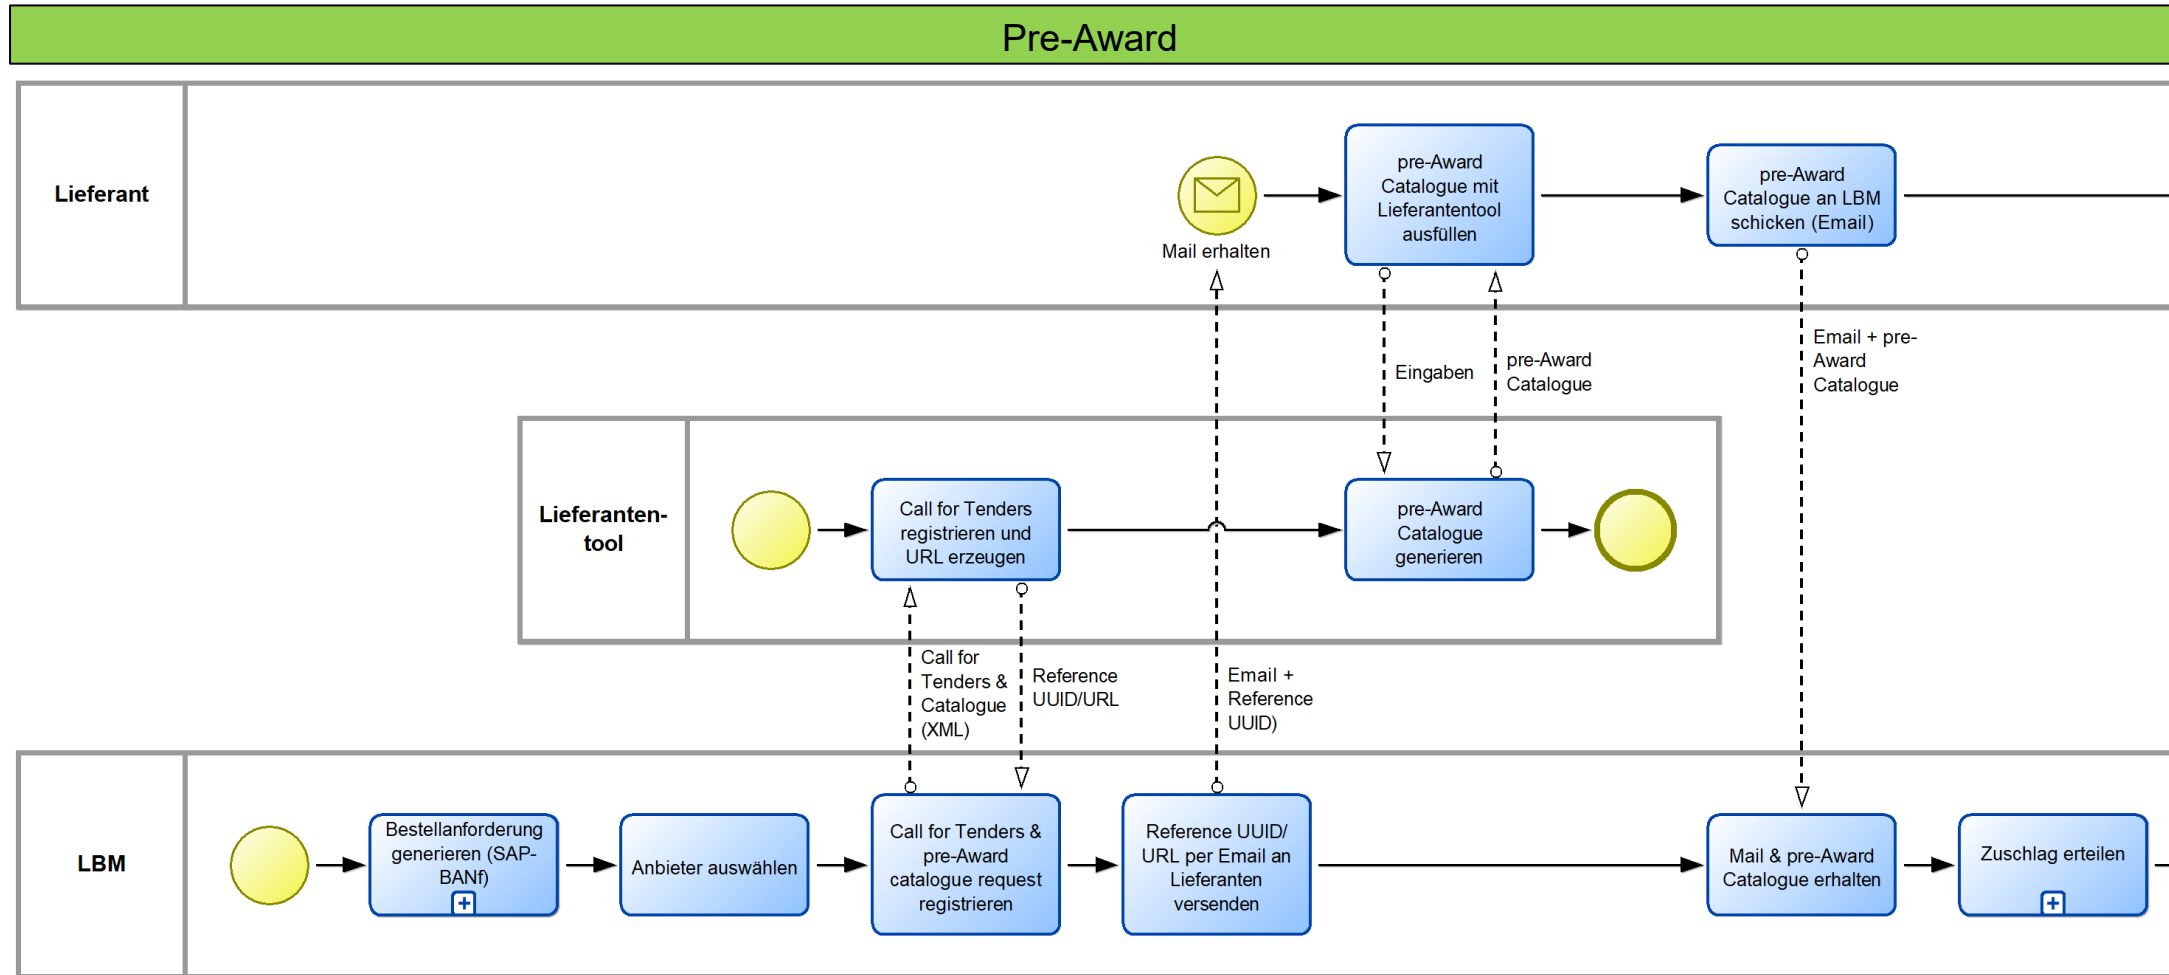

Pilotierung Post-Award

- Pilotierungsprozess Post-Award: BPMN Kollaborationsmodell

