


# **Bildungs- und Weiterbildungsplattform eGovernment (eGov-Campus)**

## **Projektstatusbericht an die FITKO**

### **1. September 2020**

# Projektplanung FIT-Phasen

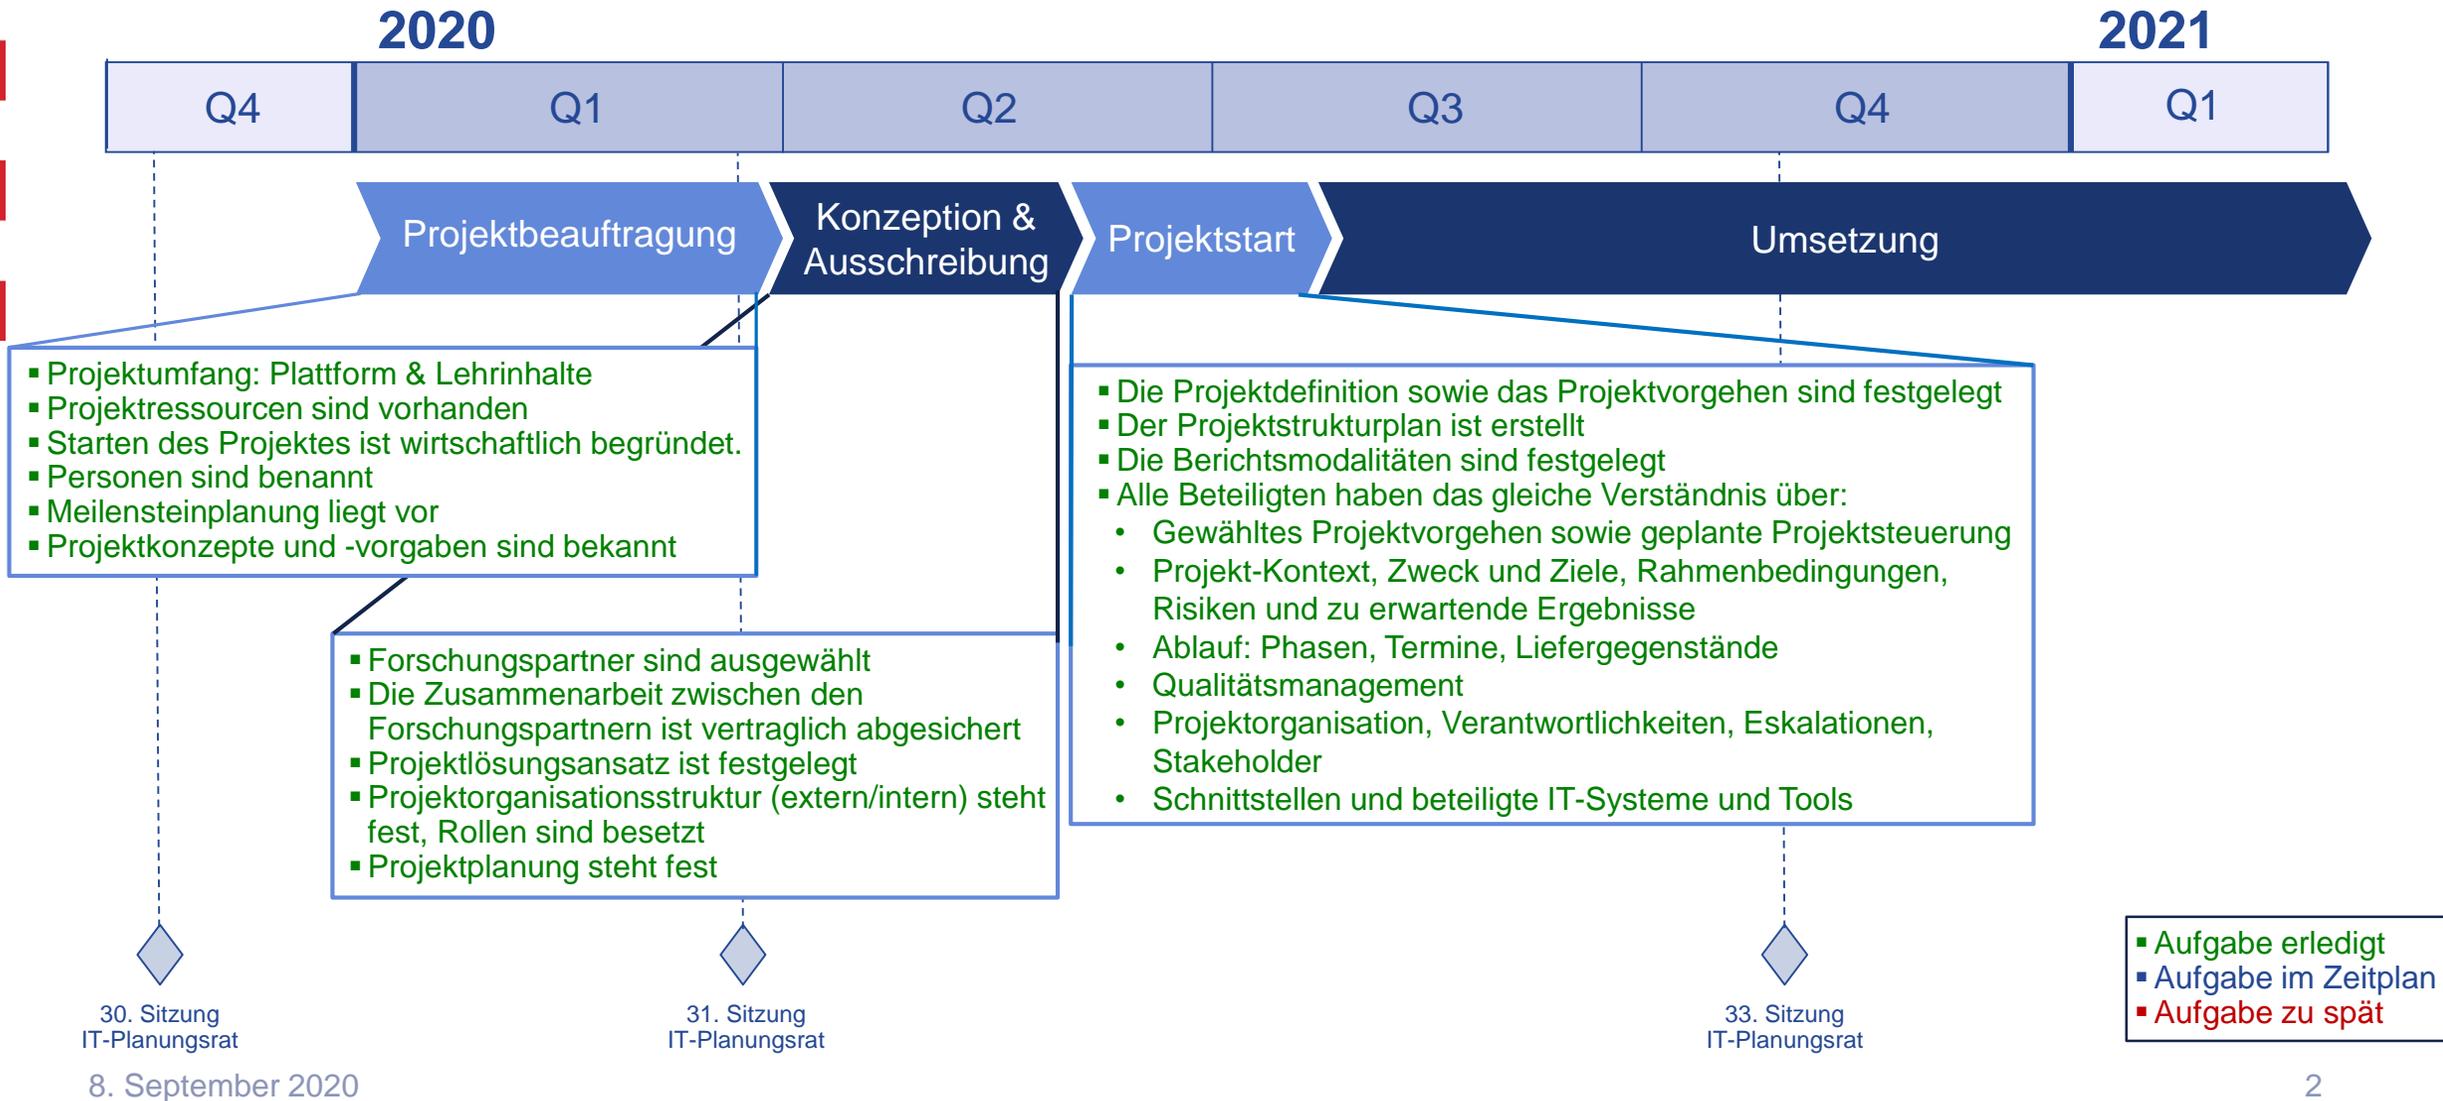

# Abschluss der FIT-Projektphase „Konzeption und Ausschreibung“

## Aufgaben

- Forschungspartner sind ausgewählt
- Die Zusammenarbeit zwischen den Forschungspartnern ist vertraglich abgesichert
- Projektlösungsansatz ist festgelegt
- Projektorganisationsstruktur (extern/intern) steht fest, Rollen sind besetzt
- Projektplanung steht fest

## Aktivitäten seit April 2020

- Förderanträge von allen Partnern der ersten Phase liegen vor, Zuwendungsbescheide sind in Arbeit
- Förderrichtlinien sind mit Einreichung der Anträge akzeptiert, erster Entwurf der Kooperationsvereinbarung wurde verteilt
- Fortlaufende enge Abstimmung der Projektpartner
- Lenkungsausschuss und Beirat sind konstituiert und arbeiten
- Rollen der Projektpartner sind in Förderanträgen beschrieben, Projektorganisation steht fest, Koordination auf vier Ebenen:
  1. Gesamtprojekt - Digitalministerium Hessen
  2. Funktionalität der Plattformentwicklung - WWU Münster
  3. Inhalte, Curriculum, Website - Hochschule RheinMain
  4. Umsetzung der Lehrmodule - Graduiertenkolleg
- Zeitplanung wird verspäteten Projekteinrichtung angepasst (+ 2-3 Monate)

→ Phase Konzeption und Ausschreibung planmäßig und vollständig abgeschlossen

## Lösungsansatz und Projektpartner


### Forschungsprojekt und Pilotierung

Das Projekt wird als Forschungsprojekt umgesetzt, bei dem die Aufgaben auf verschiedene Partner aufgeteilt werden. Die Mittelvergabe erfolgt über Zuwendungen.

### Partner für die Erarbeitung der Projektgrundlagen und -umsetzung

- Hessische Staatskanzlei – Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung
- Westfälische Wilhelms-Universität, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement, Münster
- Hochschule RheinMain, Fachbereich DCSSM, Wiesbaden
- Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH, Potsdam
- Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme FOKUS
- Universität Konstanz

# Projektorganisation

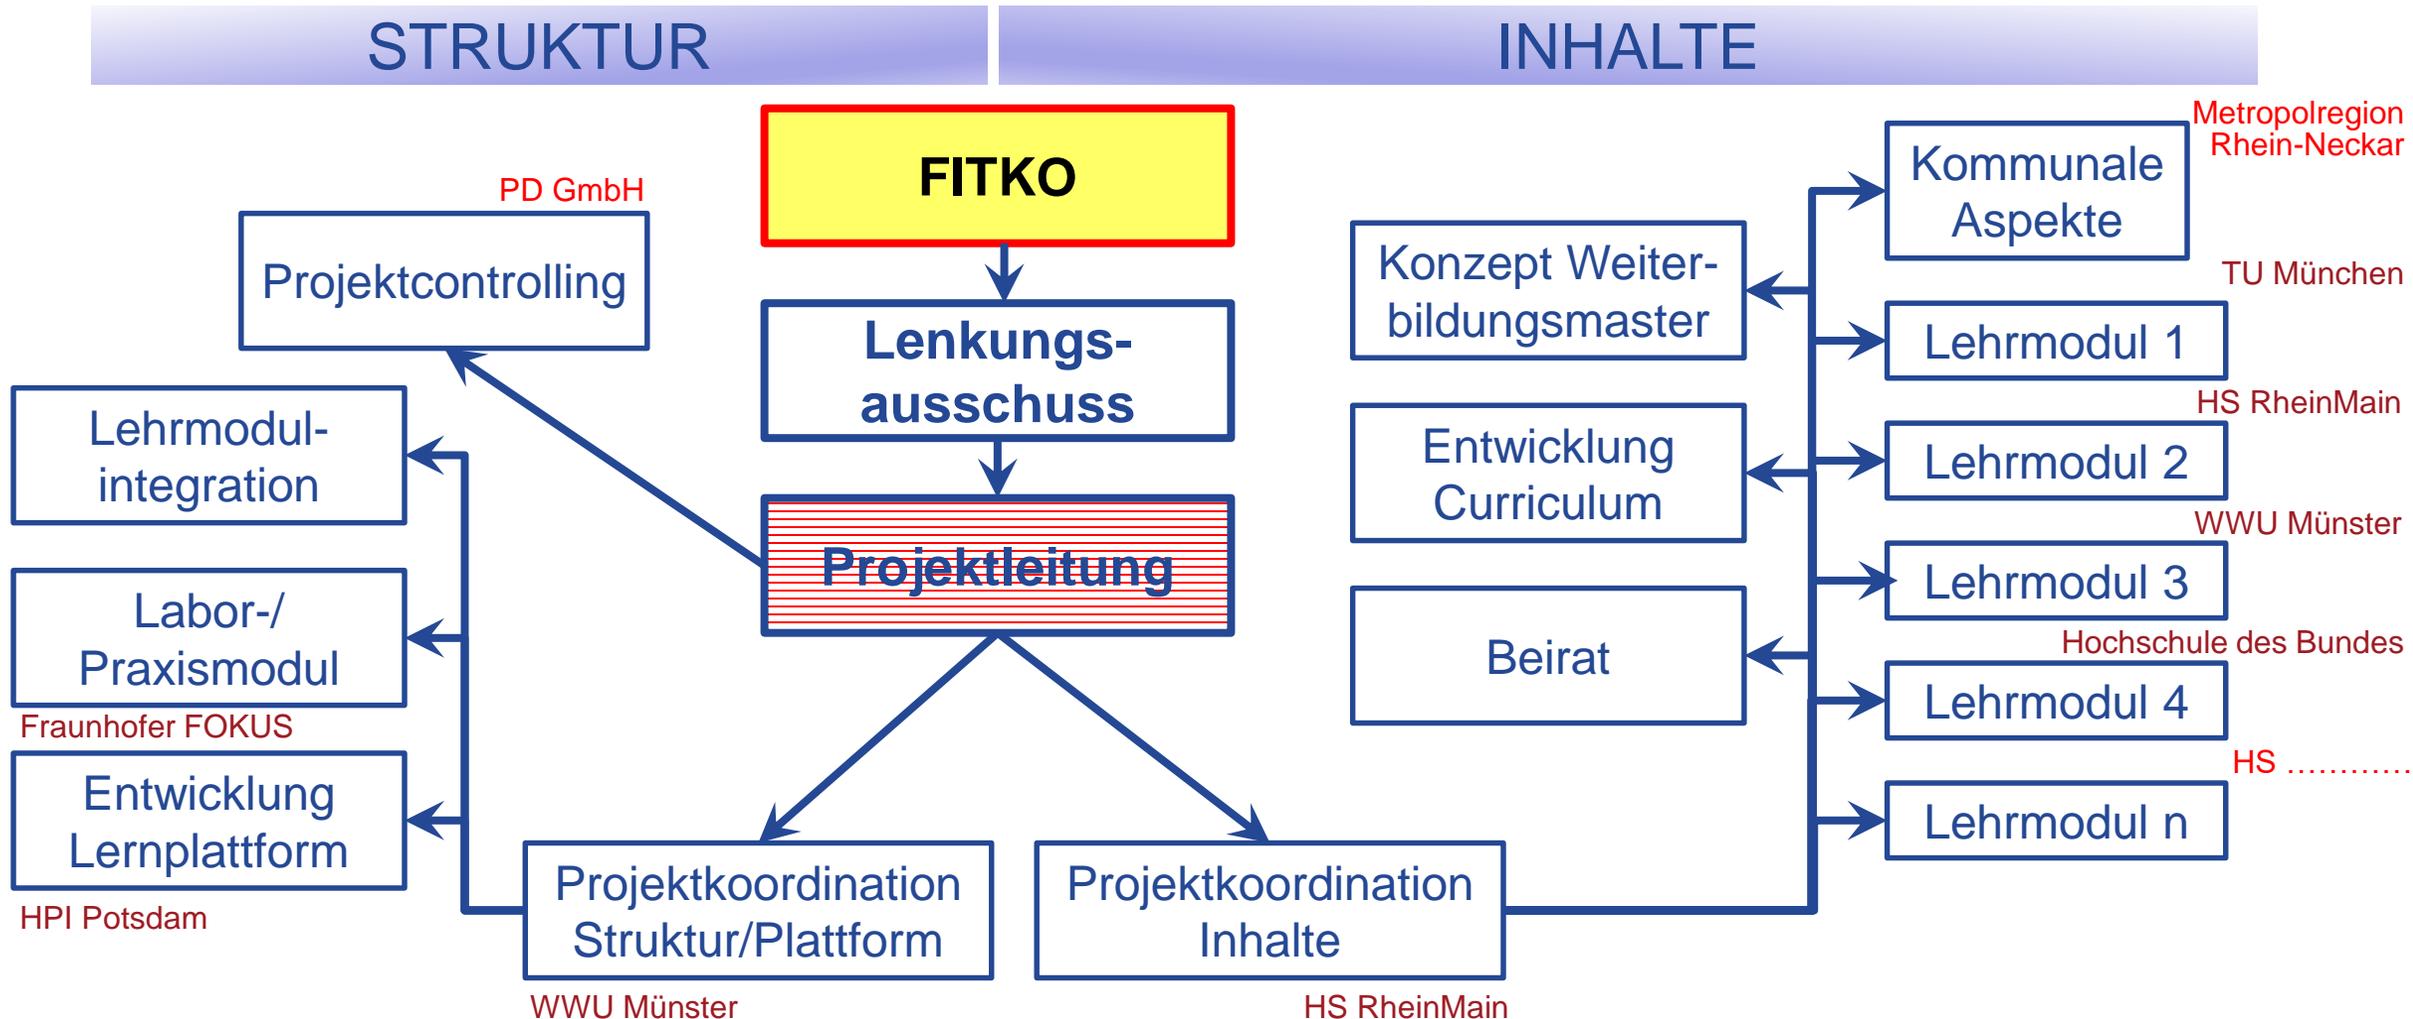

## Abschluss der FIT-Projektphase „Projektstart“

### Aufgaben



- Die Projektdefinition sowie das Projektvorgehen sind festgelegt
- Der Projektstrukturplan ist erstellt
- Die Berichtsmodalitäten sind festgelegt
- Alle Beteiligten haben das gleiche Verständnis über:
  - Gewähltes Projektvorgehen sowie geplante Projektsteuerung
  - Projekt-Kontext, Zweck und Ziele, Rahmenbedingungen, Risiken und zu erwartende Ergebnisse
  - Ablauf: Phasen, Termine, Liefergegenstände
  - Qualitätsmanagement
  - Projektorganisation, Verantwortlichkeiten, Eskalationen, Stakeholder
  - Schnittstellen und beteiligte IT-Systeme und Tools

### Aktivitäten seit April 2020

- Definition der Arbeitspakete aller Projektpartner der ersten Phase liegt vor
- Projektstruktur liegt fest
- Projektcontrolling mit Unterstützung der PD GmbH
- Fortlaufende enge Abstimmung auf den vier Ebenen: Gesamtprojekt, Plattformentwicklung, Inhalte/ Curriculum/ Website, Umsetzung der Lehrmodule
  - Fixierung der Arbeitspakete, Kontext, Zweck und Ziele in Förderrichtlinien, Zuwendungsbescheid, Kooperationsvereinbarung
  - Abstimmung über Workshops zu didaktischen Leitlinien, Umsetzung der Digitallabore/Übungen
  - Qualitätssicherung über Bewertungsprozess des Beirats


→ Phase Projektstart planmäßig und vollständig abgeschlossen

# Projektplanung Teilprojekte

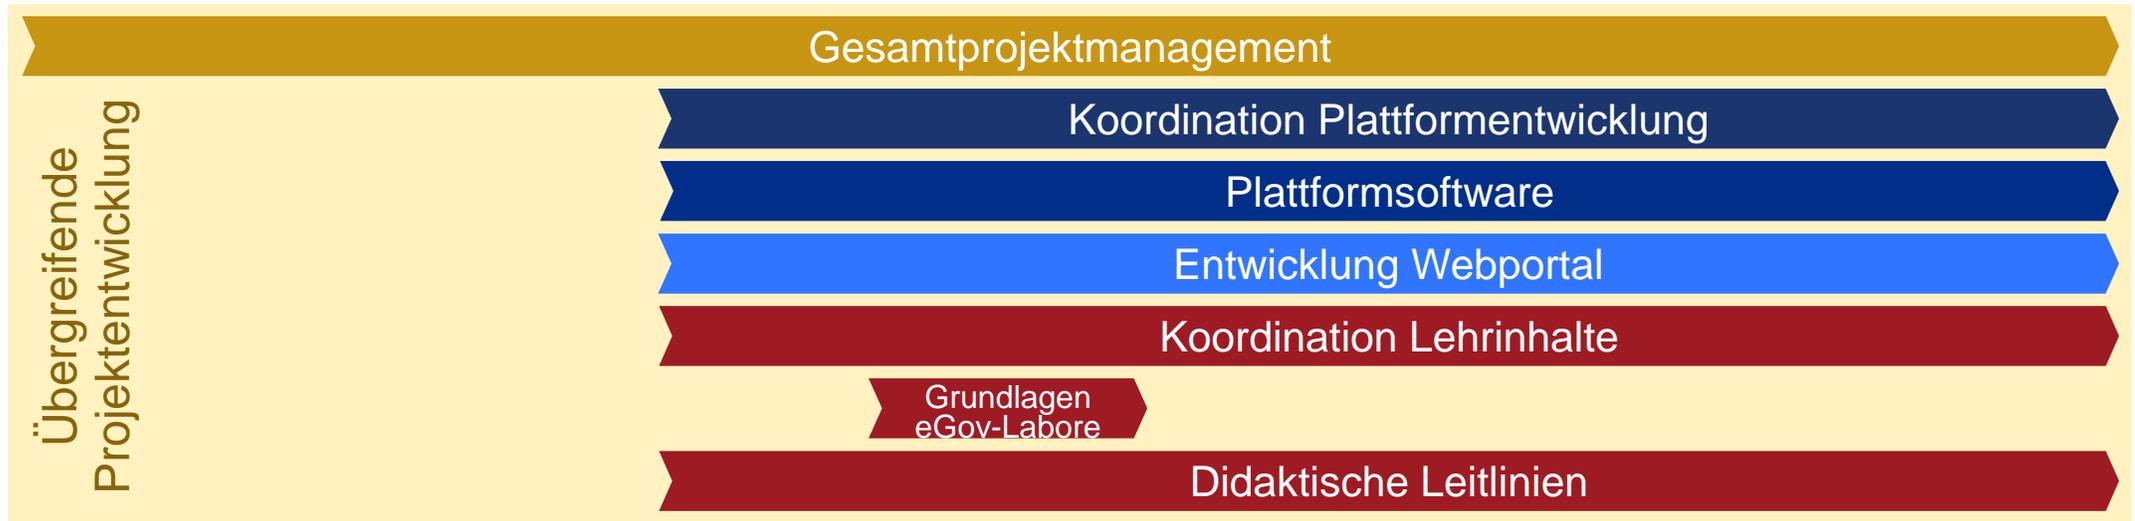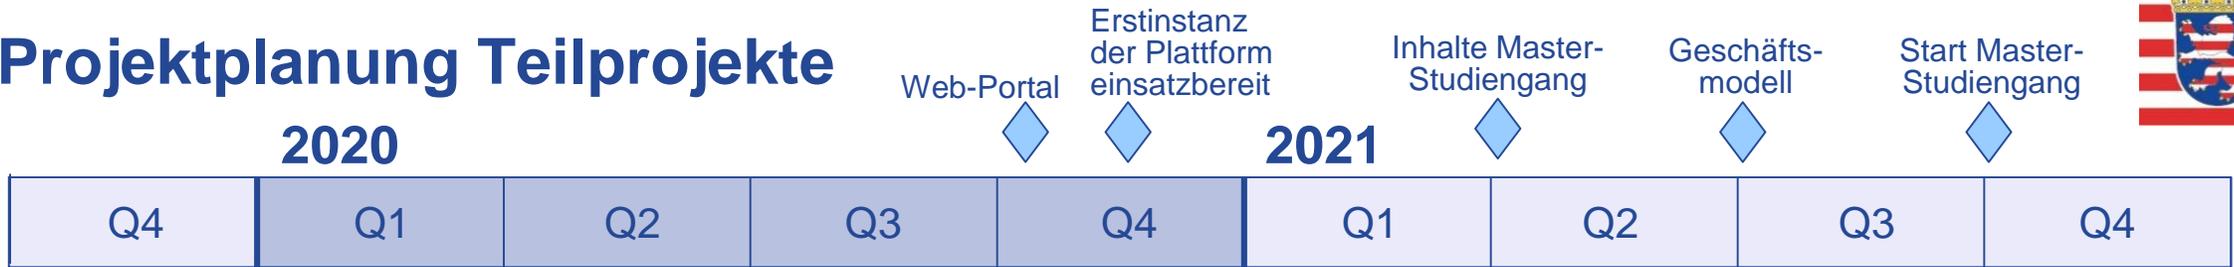


## Projektstrukturplan (Inhalte)

Die Abstimmung der Lehrmodule bezüglich didaktischem Vorgehen, Konzeptionierung und Funktionalität der Übungen erfolgt durch regelmäßige Workshops der Beteiligten.

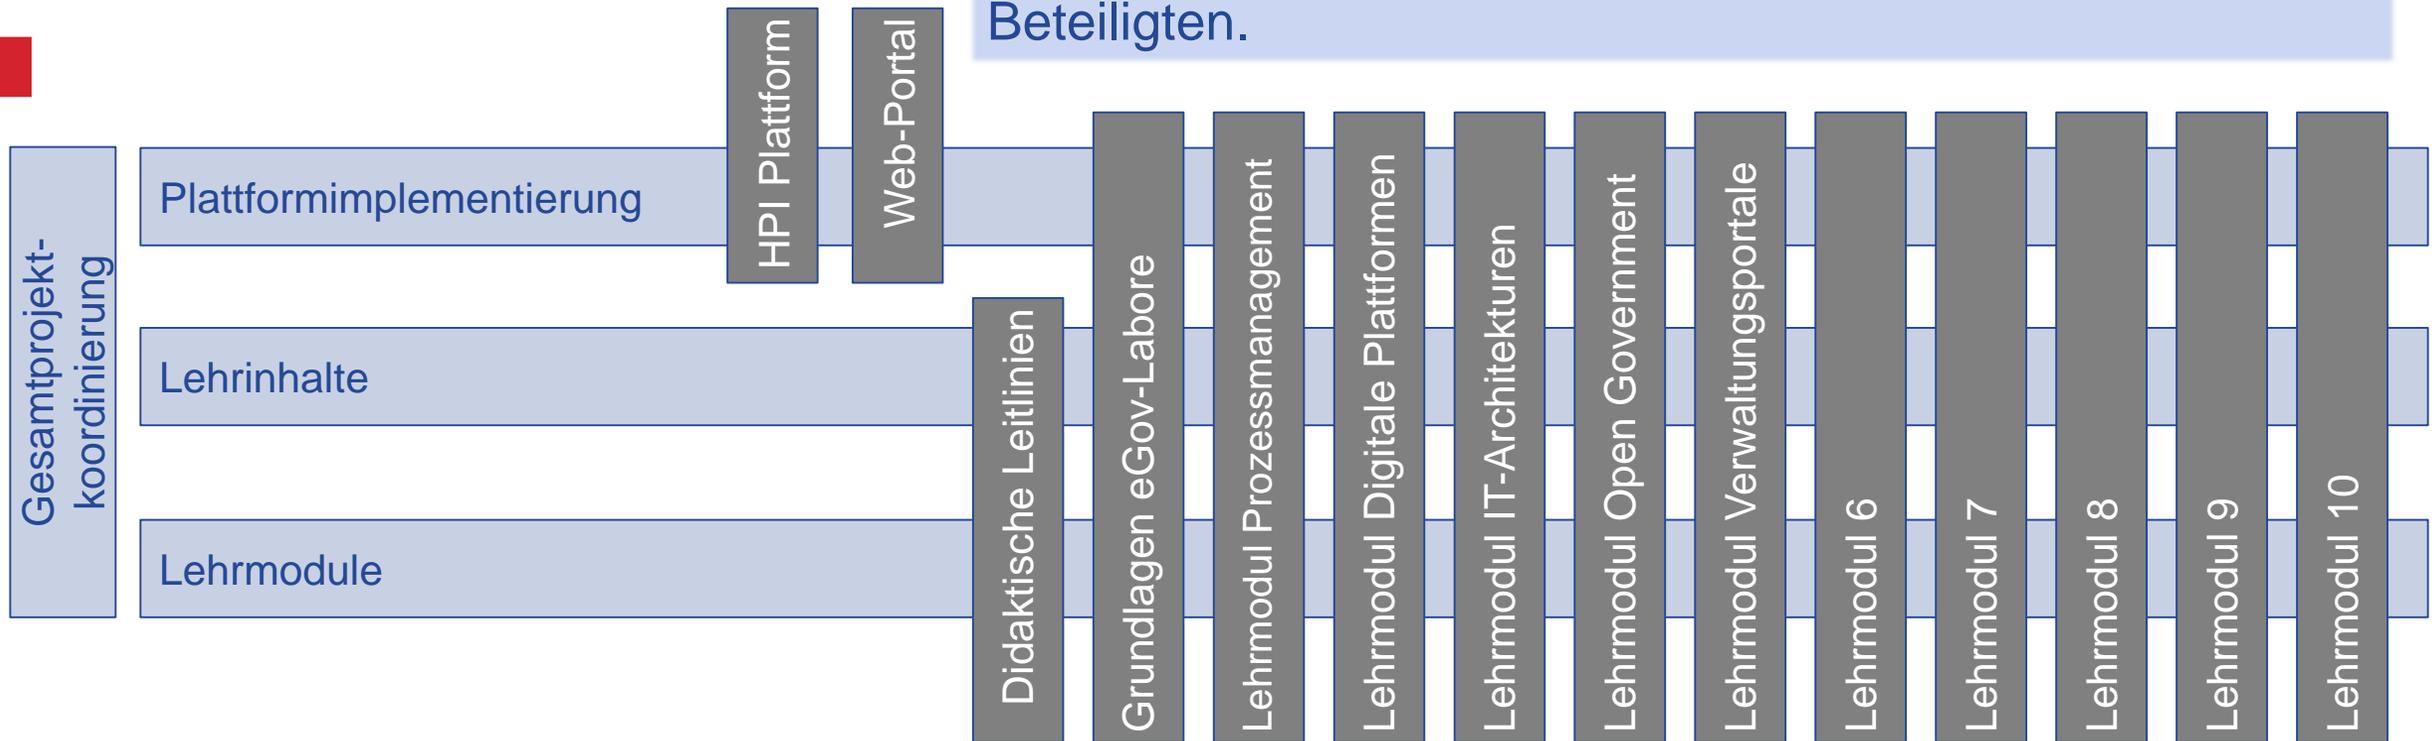

# Projektstrukturplan (Akteure)

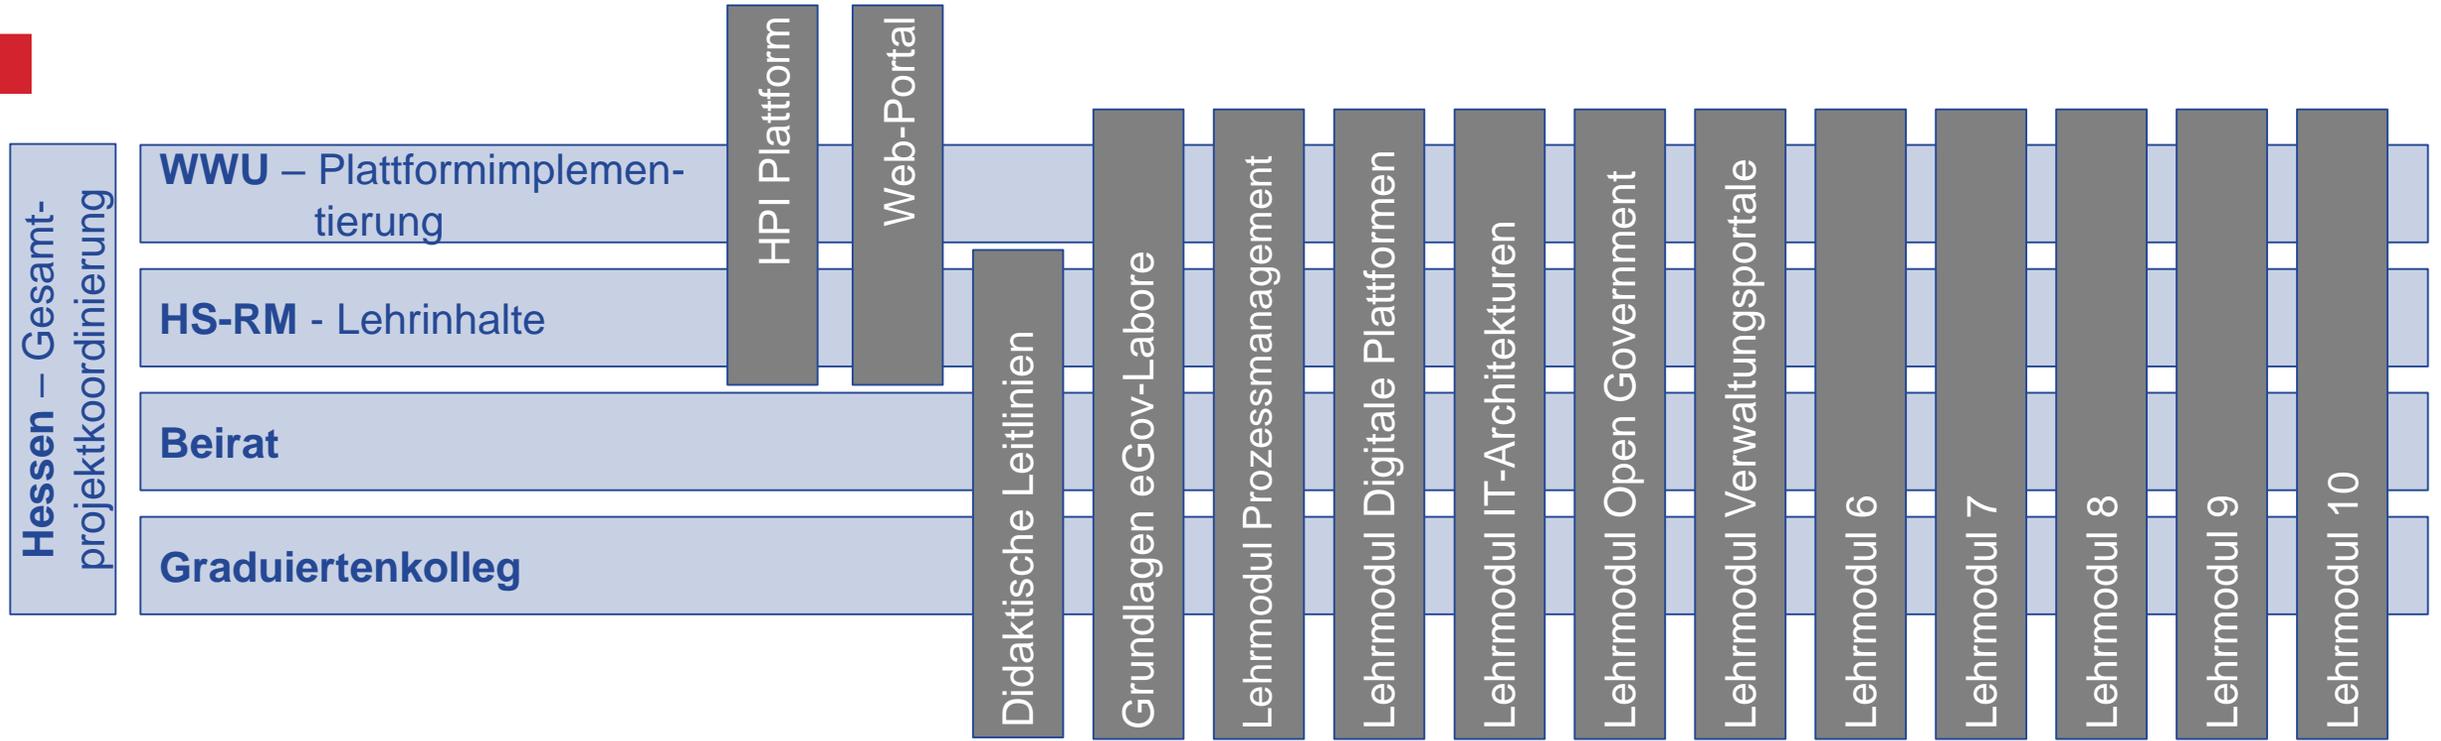


## Status Projektpartner - Plattforminfrastruktur und übergeordnete Lehrinhalte (Zuwendungsbescheide übermittelt)

Projektpartner	Aufgabe	Bewilligung	Status
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster	Konzeption & Koordination der Plattformentwicklung, Geschäftsmodelle, Marketing, Weiterbildungsstudiengang	€ 247.485	Ressourcen vorhanden, interne & externe Abstimmung läuft
Hasso-Plattner-Institut, Potsdam	Entwicklung digitale Plattform	€ 277.759	Ressourcen vorhanden, interne & externe Abstimmung läuft
Hochschule RheinMain	Koordinierung Lehrinhalte/ Module/ Curricula, Entwicklung des Web-Portals	€ 178.958	Ressourcen vorhanden, interne & externe Abstimmung läuft
Fraunhofer FOKUS	Grundlagen eGovernment-Labore	€ 53.670	Identifizierung der Ressourcen und Vorgehensweise
Universität Konstanz	Entwicklung didaktischer Leitlinien und Evaluation	€ 63.201	Ressourcen vorhanden, interne & externe Abstimmung läuft

Diese Teilprojekte laufen die gesamte Projektlaufzeit bis Dezember 2021 (mit Ausnahme der Grundlagen eGovernment-Labore). Die Verfolgung des Fortschritts der einzelnen Arbeitspakete dieser Teilprojekte ist Teil der Gesamtprojektkoordination auf den verschiedenen Ebenen.

## Status Projektpartner – Lehrmodule (Zuwendungsbescheide in Erstellung)

Projektpartner	Aufgabe	Summe	Teilprojektende	Status
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster	Prozessmanagement im öffentlichen Sektor	€ 55.015	Dezember 2020	im Plan
Technische Universität München	Digitale Plattformen als Motor der Digitalisierung in der Verwaltung	€ 75.090	Dezember 2020	im Plan
Universität Koblenz	IT-Architekturen im Kontext eGovernment	€ 71.100	Januar 2021	im Plan
Zeppelin-Universität, Friedrichshafen	Open Government	€ 99.994	August 2021	im Plan
Universität Potsdam/SHI	Verwaltungsportale	€ 70.000	März 2021	im Plan



## Projektstatusbericht – Ziele/Nutzen

### Projekt: Bildungsplattform eGovernment – eGov-Campus


	Status
<b>Projektziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schaffung einer funktionierenden Plattformsoftware mit Lehrinhalten zum Thema eGovernment auf Hochschulniveau</li><li>• Zurverfügungstellung von 15 abgeschlossenen Lehrmodulen zu Themen des eGovernment</li><li>• Umsetzung innovativer Lehr- und Lernformate</li><li>• Schaffung einer Referenz für Lehrinhalte zum Thema eGovernment</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle geplanten Partner an Bord</li><li>• Mittel reichen für ca. 13 Module, es wird versucht aus Kooperationen weitere Module ohne oder zu geringen Kosten zu bekommen</li><li>• Lehrmodule von renommierten Instituten</li><li>• Führende Hochschullehrer im Beirat</li></ul>
<b>Nutzen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zusätzliche Lernangebote fokussiert auf eGovernment-Themen von renommierten Instituten</li><li>• Zertifizierte Weiterbildungsangebote für den öffentlichen Sektor auf Hochschulniveau</li><li>• Konzept für einen modularen Aufbau von Bildungsplattformen und Realisierung von Synergien aus unterschiedlichen Projekten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Im Plan</li><li>• Im Plan</li><li>• Enge Abstimmung mit Projekten „KI-Campus“ und Absprache mit „Qualifica Digitalis“ und „KommunalCampus“</li></ul>

## Projektstatusbericht Risiken

### Projekt: Bildungsplattform eGovernment – eGov-Campus


#### Risiken


- Technische Umsetzung: regelmäßige Statusberichte, Verfolgung von Meilensteinen
- Nutzerinteresse: hohes Interesse an online-Lehrformaten
- Weiterbildungsnachfrage: noch kein Produkt, das Nachfrage generiert; Präsentationen auf einschlägigen Kongressen und Publikationen
- Koordination der Projektpartner: „learning on the fly“, viel Kommunikation auf mehreren Ebenen



#### Zeitplan

- Verzögerung des Projektstarts durch Neudefinition der administrativen Prozesse
- Die ersten drei FIT-Projektphasen wurden planmäßig abgeschlossen
- Alle erforderliche Ressourcen stehen zur Verfügung
- Unkritische Verzögerung der Inbetriebnahme um ca. zwei Monate





## Projektstatusbericht Finanzen

### Projektmittel-Finanzen

- Projektmanagement
- Konzeption & Koordination der Plattformentwicklung inkl. Geschäftsmodelle, Marketing, wissenschaftliche Koordination
- Weiterentwicklung Plattform-Software
- Konzeption, Design und Entwicklung des Web-Portals
- Koordination der Lehrinhalte, inkl. didaktische & wissenschaftliche Begleitung
- Grundlagen eGovernment-Labore
- 5 Lehrmodule „erste Welle“
- Weitere Lehrmodule „zweite Welle“
- Weiterentwicklung eGovernment-Labore (bei Bedarf)

Total

<u>geplant</u>	<u>bewilligt</u>	<u>ausgegeben</u>
€	€	€
210.000	210.000	90.000
217.000	217.000	
278.000	278.000	
123.000	123.000	
149.000	149.000	
54.000	54.000	
371.000		
522.000		
<u>76.000</u>		
<u>2.000.000</u>	<u>1.031.000</u>	<u>90.000</u>
