

# Bericht des Programmmanagements im BMI



# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement


- Fokusleistungen

# OZG-Umsetzungsfortschritt Föderal

Stand: 01.08.2023<sup>1</sup>

## OZG-Umsetzungsfortschritt im Programm Föderal

Anzahl der Leistungen, N=236<sup>2</sup>, Differenz zum Vormonat in Klammern

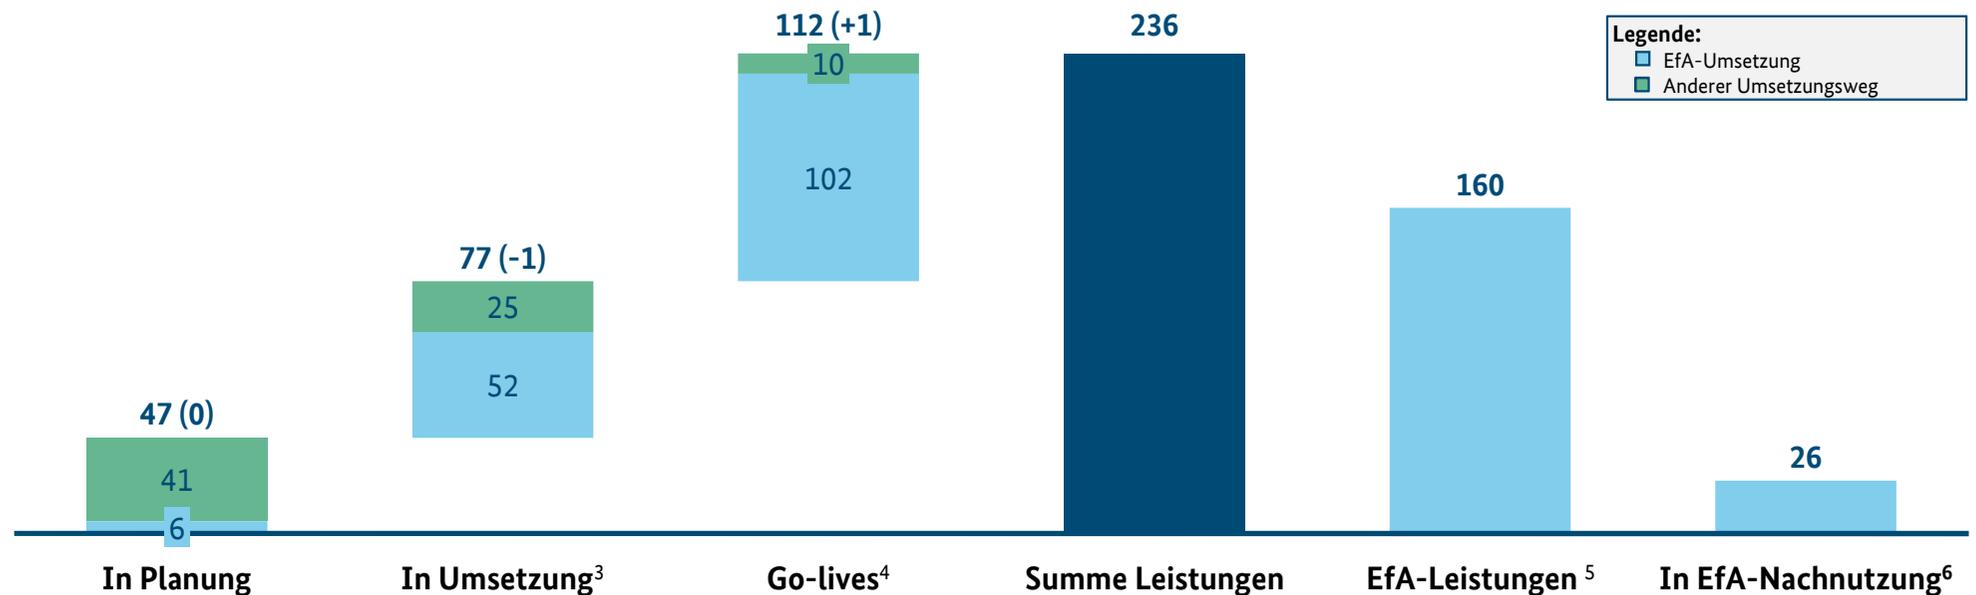

**Legende:**  
■ EfA-Umsetzung  
■ Anderer Umsetzungsweg



- Stand zum 01.08.2023, Quelle: OZG-Informationsplattform; 2. Föderale und kommunale Leistungen, die weder programmunabhängig noch depriorisiert sind; 3. Steuerungskreis aufgesetzt; 4. Go-live (MVP) erfolgt, Weiterentwicklung in Ausbaustufen vorgesehen; 5. Bestehend aus 153 vom Bund finanzierten EfA-Leistungen und 7 Leistungen länderspezifisch; 6. Quelle: OZG Informationsplattform; Anzahl der OZG-Leistungen, die in mehr als einem Land verfügbar sind.

# Stand der EfA-Nachnutzung-Themenfelder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föederal – Stand: 18.08.2023

Themenfeld	Anzahl EfA-Online-Services <sup>1</sup>	Zur Nachnutzung verfügbar	In mind. zwei BL nachgenutzt	In mind. 9 BL nachgenutzt	Anteil der tatsächlich nachgenutzten Online-Services <sup>2</sup>
Arbeit & Ruhestand	25	25	6	3	
Bauen & Wohnen	4	3	1	0	
Bildung	12	6	3	2	
Ein- & Auswanderung	5	4	4	2	
Engagement & Hobby	11	3	0	0	
Familie & Kind	11	9	3	2	
Forschung & Förderung	1	1	1	1	
Gesundheit	13	13	0	0	
Mobilität & Reisen	12	7	1	0	
Querschnittsleistungen	9	1	0	0	kein OS verfügbar
Recht & Ordnung	3	2	1	1	
Steuern & Zoll	6	6	3	2	
Umwelt	39	9	2	0	
Unternehmensführung & -entwicklung	95	94	1	0	
	<b>246</b>	<b>183</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	

- Online-Service wird in mind. 2 BL. angeboten
- Online-Service ist zur Nachnutzung verfügbar und wird noch nicht in anderen BL nachgenutzt

1. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-IP gepflegten Online-Services (OS). Berücksichtigt werden ausschließlich die OS, die zu mind. einer OZG-Leistung mit dem erledigten SI 8 „Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgeführt“ zugeordnet sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.

2. Die Anzahl der tatsächlich nachgenutzten OS (verfügbar in mind. 2 BL.) wird mit der Gesamtzahl der zur Nachnutzung verfügbaren OS in Verhältnis gesetzt.

# Stand der EfA-Nachnutzung-Bundesländer

## Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal – Stand: 18.08.2023

Bundesland	ANGEBOT			NACHNUTZUNG	
	Anzahl der EfA-Online-Services <sup>1</sup>	Vom Land angebotene Online-Services	Anteil der zur Nachnutzung angebotenen OS <sup>2</sup>	Im Land nachgenutzte Online-Services	Anteil der nachgenutzten OS <sup>3</sup>
Baden-Württemberg	6	1		15	
Bayern	3	3		10	
Berlin	7	0		7	
Brandenburg	3	2		12	
Bremen	9	8		10	
Hamburg	26	25		12	
Hessen	12	11		13	
Mecklenburg-Vorpommern	2	2		16	
Niedersachsen	13	13		16	
Nordrhein-Westfalen	103	99		10	
Rheinland-Pfalz	17	1		20	
Saarland	1	1		11	
Sachsen	4	1		15	
Sachsen-Anhalt	10	5		12	
Schleswig-Holstein	10	3		16	
Thüringen	0	0	kein OS verfügbar	16	
	<b>230</b>	<b>177</b>			

- Online-Service wird zur Nachnutzung angeboten
- Online-Service wird noch nicht zur Nachnutzung angeboten
- Online-Services werden nachgenutzt
- Online-Services werden noch nicht nachgenutzt

1. Die Zahlen umfassen die auf der OZG-IP gepflegten Online-Services (OS). Berücksichtigt werden ausschließlich die OS, die zu mind. einer OZG-Leistung mit dem erledigten SI 8 „Ist-Analyse und LeiKa-Validierung durchgeführt“ zugeordnet sind und EfA als angewandtes Nachnutzungsmodell eingetragen haben.
2. Die Anzahl der vom BL zur Nachnutzung angebotenen OS wird mit der Gesamtzahl der in dem jeweiligen BL umgesetzten OS in Verhältnis gesetzt.
3. Die Anzahl der vom jeweiligen BL nachgenutzten OS wird mit der Gesamtzahl der zur Nachnutzung angebotenen EfA Online-Services in Verhältnis gesetzt.
4. In Kooperation entwickelte EfA-OS von RP und HE sowie RP und SH werden hier nicht separat aufgeführt. In der Gesamtanzahl sind diese 2 Services aber enthalten

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung


- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement

- Fokusleistungen

# Budget-Übersicht OZG Föderal Themenfelder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal, Stand: 07.08.2023

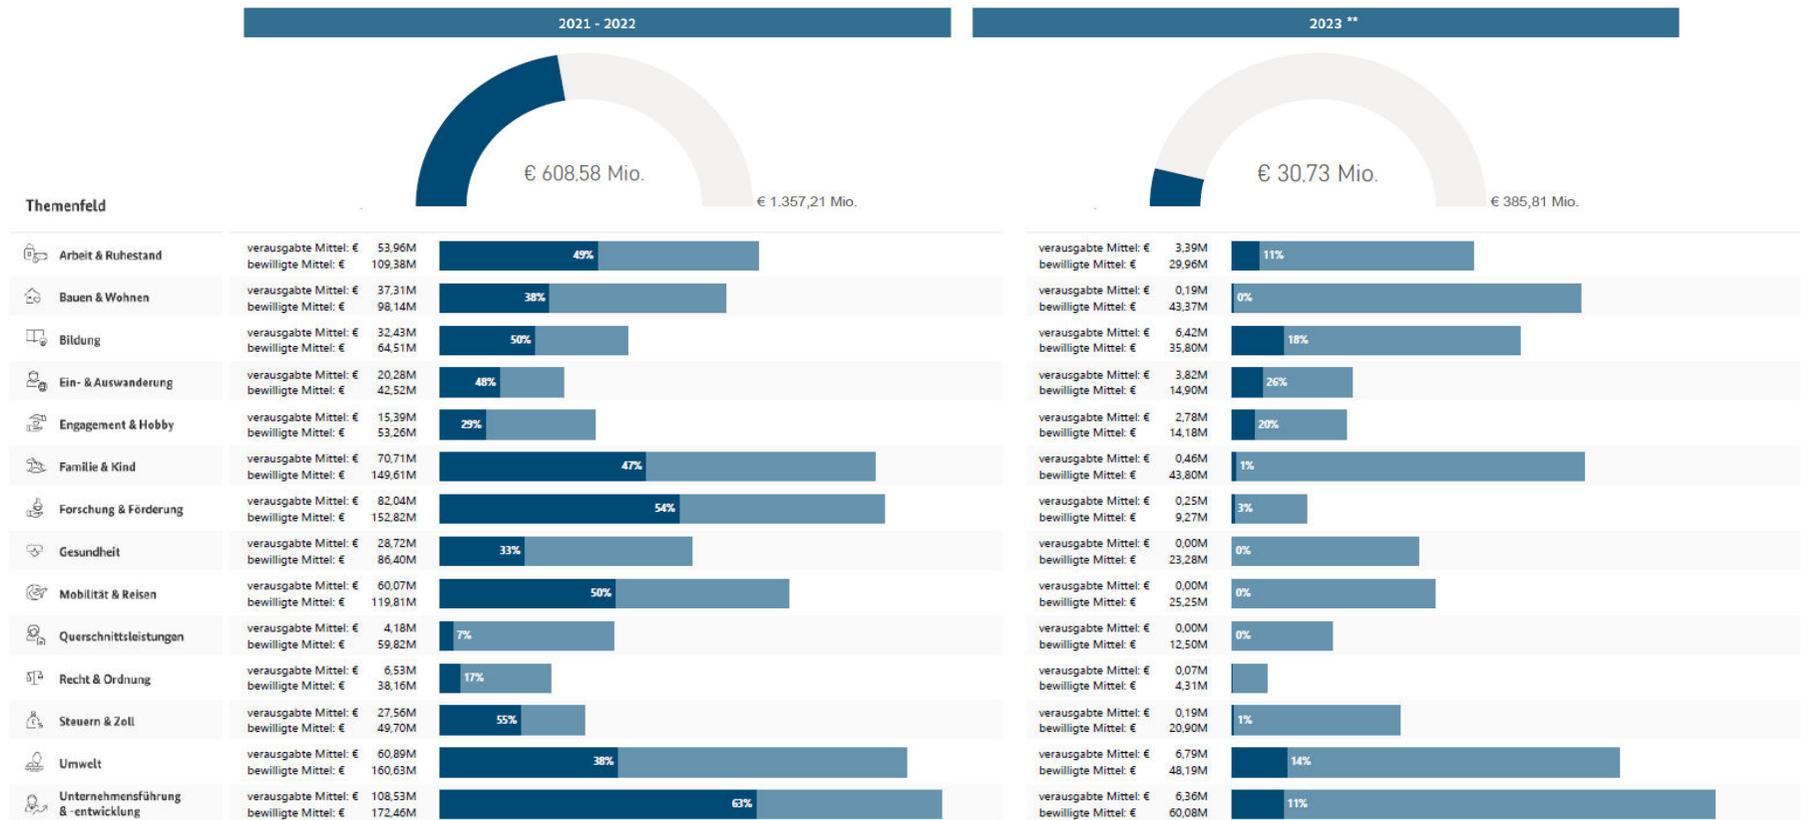

Die Overhead-Anträge sind inkludiert. Die Nachnutzungsverprobungen sind nicht inkludiert. Die Prozentangaben entsprechen dem Anteil der verausgabten Mittel an den bewilligten Mitteln.


\* Stand der bewilligten Mittel. Verausgabte Mittel des Vormonats werden ab dem 15. Werktag des laufenden Monats ausgewiesen.

\*\* Die bewilligten Mittel bilden nur einen Teilbetrag für 2023 (50%) ab, der aktuell zur Verfügung steht.

● bewilligte Mittel ● verausgabte Mittel

# Budget-Übersicht OZG Föderal Länder

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal, Stand: 07.08.2023

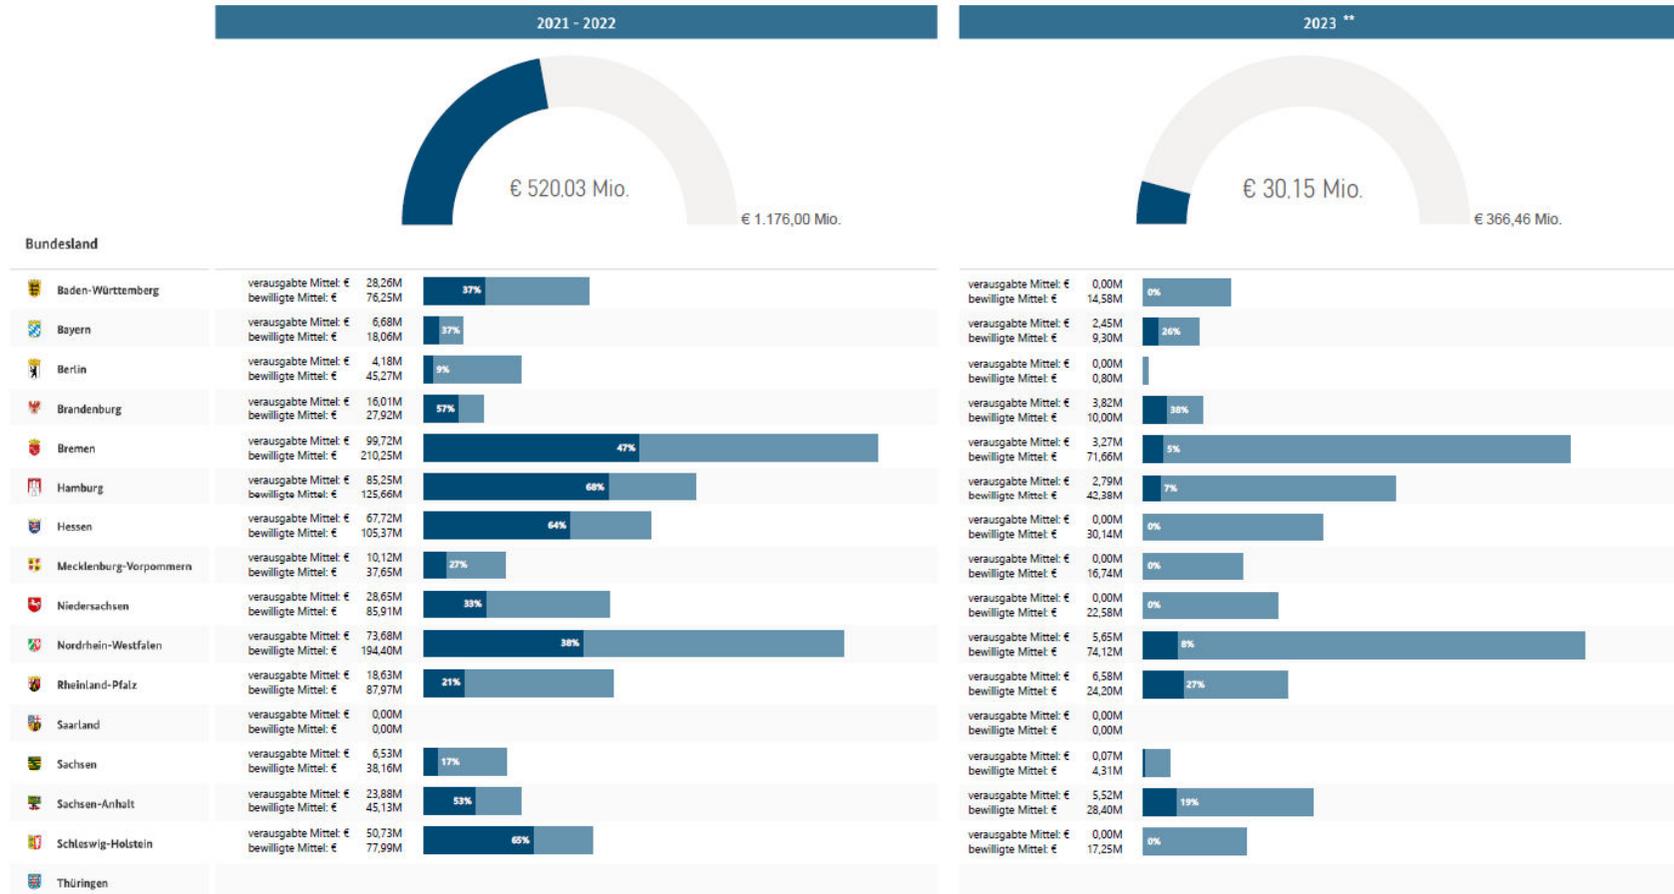

Die Overhead-Anträge und Nachnutzungsverprobungen sind nicht inkludiert.  
Die Prozentangaben entsprechen dem Anteil der verausgabten Mittel an den bewilligten Mitteln.  
\* Stand der bewilligten Mittel. Verausgabte Mittel des Vormonats werden ab dem 15. Werktag des laufenden Monats ausgewiesen.  
\*\* Die bewilligten Mittel bilden nur einen Teilbetrag für 2023 (50%) ab, der aktuell zur Verfügung steht.

● bewilligte Mittel      ● verausgabte Mittel

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement


- Fokusleistungen

# Meilensteinfortschrittsbericht

Stand: 01.08.2023<sup>1</sup>

● Erledigt
 ● Begonnen
 ● Offen


Meilenstein 1  
Konzeption

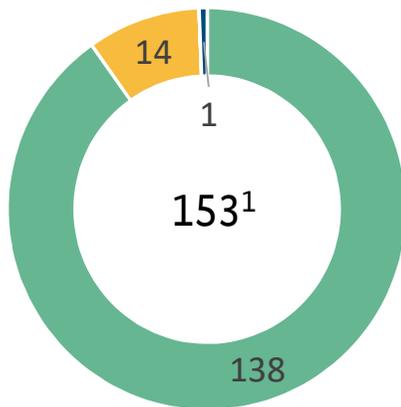

138 Leistungen haben den MS1 abgenommen

14 weitere sind begonnen


Meilenstein 2  
Referenzimplementierung

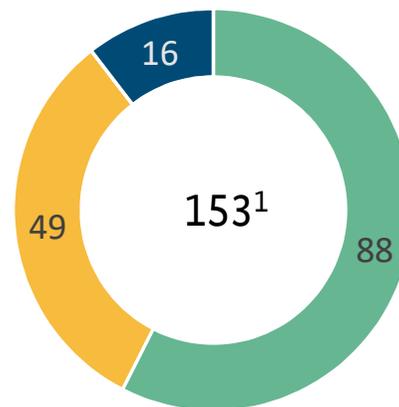

88 Leistungen haben den MS2 erledigt

49 weitere sind begonnen

Meilenstein 3  
Rollout in weitere Länder

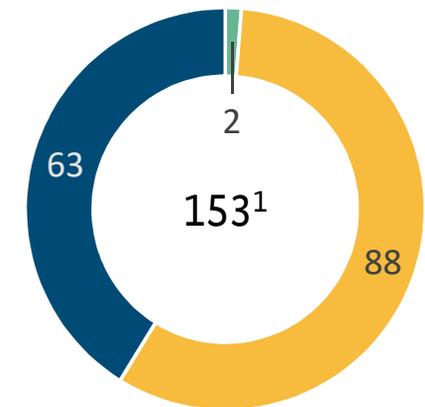

2 Leistungen haben bereits MS3 erledigt

88 weitere sind begonnen



1. Basis der Betrachtung des Meilensteinfortschritts bilden die 153 OZG-Leistungen mit abgeschlossenem Steuerungsindikator 3: „Projektantrag durch BMI Programmmanagement formal geprüft und genehmigt“. Sie sind Teil der Grundgesamtheit der 236 föderalen OZG-Leistungen.

# Agenda

## 1. Fortschritt OZG-Umsetzung

- Status Digitalisierung von OZG-Leistungen
- Übersicht Mittelbewilligung und Mittelverausgabung
- Status Meilensteine

## 2. Update aus dem Programmmanagement


- Fokusleistungen

# Umsetzungsfortschritt Fokusleistungen

Stand: 01.08.2023<sup>1</sup>

● Erledigt ● Begonnen ● Verzögert


Konzeption

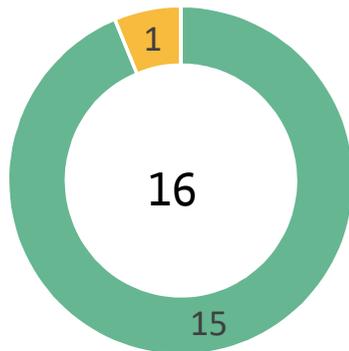

15 Leistungen haben den MS1 erledigt

1 Leistung ist begonnen

Go-live

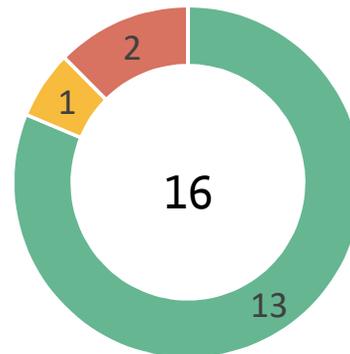


13 Leistungen haben den Go-live erledigt

1 Leistung ist begonnen

2 weitere sind verzögert

Referenzimplementierung

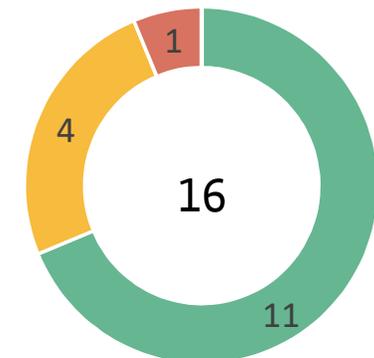

11 Leistungen haben den MS2 erledigt

4 Leistungen sind begonnen

1 weitere ist verzögert

# Aktueller Sachstand - Fokusleistungen

## Monitoring in St-Runde des Bundes Monatliche Vorstellung von 3 Leistungen und Diskussion von Unterstützungsmaßnahmen

Wohngeld 2.0

Führerschein

Ummeldung

Elterngeld Digital

Personalausweis

Unternehmensanmeldung und -  
genehmigung

Energiepauschale für Studierende

Unterhaltsvorschuss

Schließung

Vorbescheid und  
Genehmigung

Anlagengenehmigung

Bürgergeld

# Anhang

# Stand der Themenfeld-Bearbeitung

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal, Stand: 14.08.2023

Monitoring Digitalisierungsprogramm Föderal

Themenfeld	Anzahl OZG-Leistungen II		Anzahl gestrichelte OZG-Leistungen		KONZEPTION (MS 1)				REFERENZIMPLEMENTIERUNG (MS 2)				ROLLOUT (MS 3)				Veränderung zum Stand vor 4 Wochen †	Anzahl des Digitalisierungsprogramms umgesetzt †															
	geplant	erledigt	geplant	erledigt	Meilenstein 1 "Konzeption"	Go Live beständig	Alle relevanten Leitke in Rollout 3 umgesetzt	Meilenstein 2 "Referenzimplementierung"	Nachnutzung des MVPs für 50% der Bevölkerung möglich	Flächendeckung	Meilenstein 3 "Nachnutzung"	Veränderung zum Stand vor 4 Wochen †	Anzahl des Digitalisierungsprogramms umgesetzt †																				
Arbeit & Ruhestand	18	16	18	16	15	1	2	4	1	9	5	1	11	14	1	2	4	12	2	14	2	2	1	14	1	2	2	↑	1				
Bauen & Wohnen	33	10	27	10	4	3	23	12	3	18	7	2	3	21	3	4	23	3	5	23	4	4	23	4	5	23	4	5	23	2	↑	1	
Bildung	11	7	9	7	7	4		7	1	3	2	3	4		5	2	4	2	3	1	1	4	4	1	2	4	4	1	2	4	-1	↓	2
Ein- & Auswanderung	5	5	5	5	5			4	1		1	1	1	2	4	1		2	2	1	4	1	4	1		4	1		0	→	0		
Engagement & Hobby	22	7	10	7	7	15		6	3	14	4	3	15		3	3	15	5	2	15	5	2	15	5	2	15	5	2	15	2	↑	4	
Familie & Kind	22	18	18	18	18	4		15	1	4	12	4	4		15	1	2	4	11	1	2	4	15	1	2	4	15	1	2	4	-1	↓	14
Forschung & Förderung	10	1	1	1	1	9		2	8		2	8		1	9		1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	0	→	1
Gesundheit	16	11	15	11	11	5		14	2		13	3		5	4	5		3	8	5	11	5	11	5		11	5		0	→	30		
Mobilität & Reisen	14	13	13	13	13	1		10	1	3	4	1	1	4	4	1	5	1	5	7	1	4	7	1	4	7	1	4	7	1	1	↑	7
Querschnittsleistungen	14	11	7	7	1	3	7	3	1	10	3	1	10	3	1	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	0	→	4	
Recht & Ordnung	4	4	4	4	4			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	→	7
Steuern & Zoll	10	8	10	8	6	2		7	3		7	1	2		6	2		4	2	2	7	1	2	7	1	2	7	1	2	2	↑	8	
Umwelt	34	20	28	20	20	14		7	11	15	3	3	14	14	5	3	12	14	2	9	9	14	9	14	9	14	9	14	9	14	7	↑	1
Unternehmensführung & -entwicklung	23	22	22	22	22	1		21	2		20	2	1		19	3	1	14	6	1	20	2	1	20	2	1	20	2	1	1	↑	7	
<b>Gesamt</b>	<b>236</b>	<b>153</b>	<b>187</b>	<b>149</b>	<b>138</b>	<b>43</b>		<b>113</b>	<b>21</b>	<b>94</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>106</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>117</b>	<b>43</b>	<b>71</b>	<b>22</b>	<b>83</b>	<b>104</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>104</b>	<b>27</b>	<b>83</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>↑</b>	<b>87</b>			



- Der Report bezieht sich auf alle Leistungen der Zuständigkeits-Typen 2-5 mit der Priorität 1,2,3 oder noch offen, die innerhalb des Digitalisierungsprogramms umgesetzt werden.
- Leistungen aller Zuständigkeits-Typen werden miteinbezogen.
- Die Anzahl entspricht den meilensteinrelevanten Leistungsindikatoren (SI), bei denen sich der „erledigt“-Status verändert hat.

- Steuerung Indikator trifft für diese Leistungen nicht zu
- keine Soll Daten vorhanden
- Entspricht der Planung
- Gefährdet
- Verzögert
- Erledigt
