

29.04.2025



29.04.2025

39. Sitzung der AL

TOP: Registermodernisierung

TOP: Registermodernisierung



Michael Pfleger
Gesamtprogrammleitung
Registermodernisierung

Gesamtprogrammleitung
Registermodernisierung



Projektplanung NOOTS & NOOTS Use cases

Projektstruktur

In Kooperation mit zwei federführenden Bundesländern wird das NOOTS Ende 2025 als MVP bereitgestellt.

- Entwicklung und Bereitstellung des NOOTS als MVP
(NOOTS MVP)
- Gesamtverantwortung:
Bundesverwaltungsamt,
Claus Hackethal
- Projektleitung:
André Nollmann

1. Bürgerinitiiertter Use Case zum Bewohnerparkausweis (NOOTS UC 01_2025)

Gesamtverantwortung:

FF BW, Martina Steinecke & David Romero

Projektleitung:
FF BW, Martina Steinecke & David Romero

2. Unternehmensinitiiertter Use Case zur Gewerbeanmeldung (NOOTS UC 02_2025)

Gesamtverantwortung:


FF NW, Jasmin Deling

Projektleitung:

FF NW, Johannes Söpper

Phasen- & Umsetzungsplan


Eine synchronisierte, getaktete Umsetzungsplanung ist der Schlüsselerfolgsweg

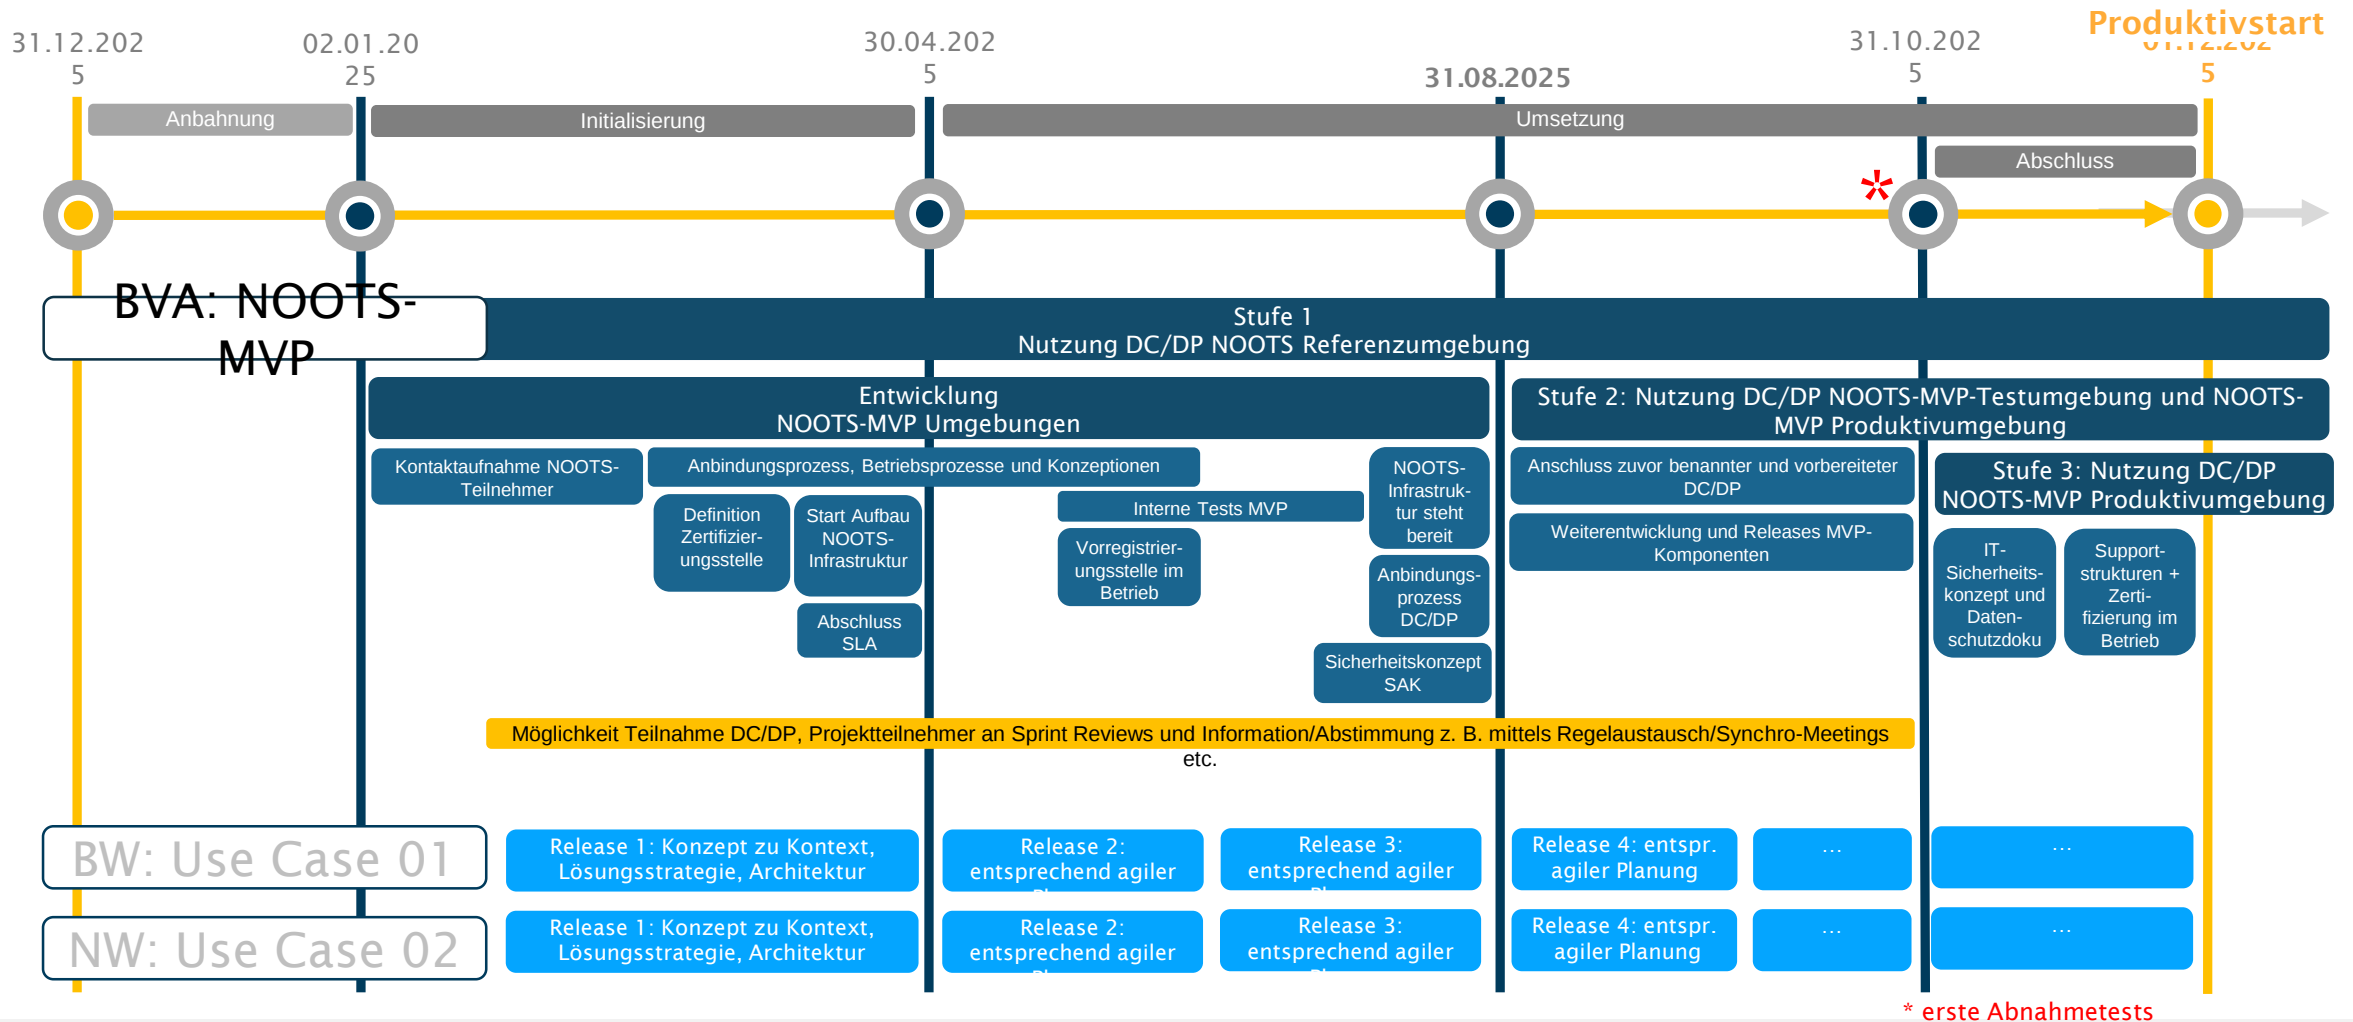

FF BW – Use Case 01 (bürgerinitiiert)

- Phasen & Umsetzungsplan
- Projektstrukturplan

Fokus BW Use Case 01 (bürgerinitiiert) - Phasen- & Umsetzungsplan

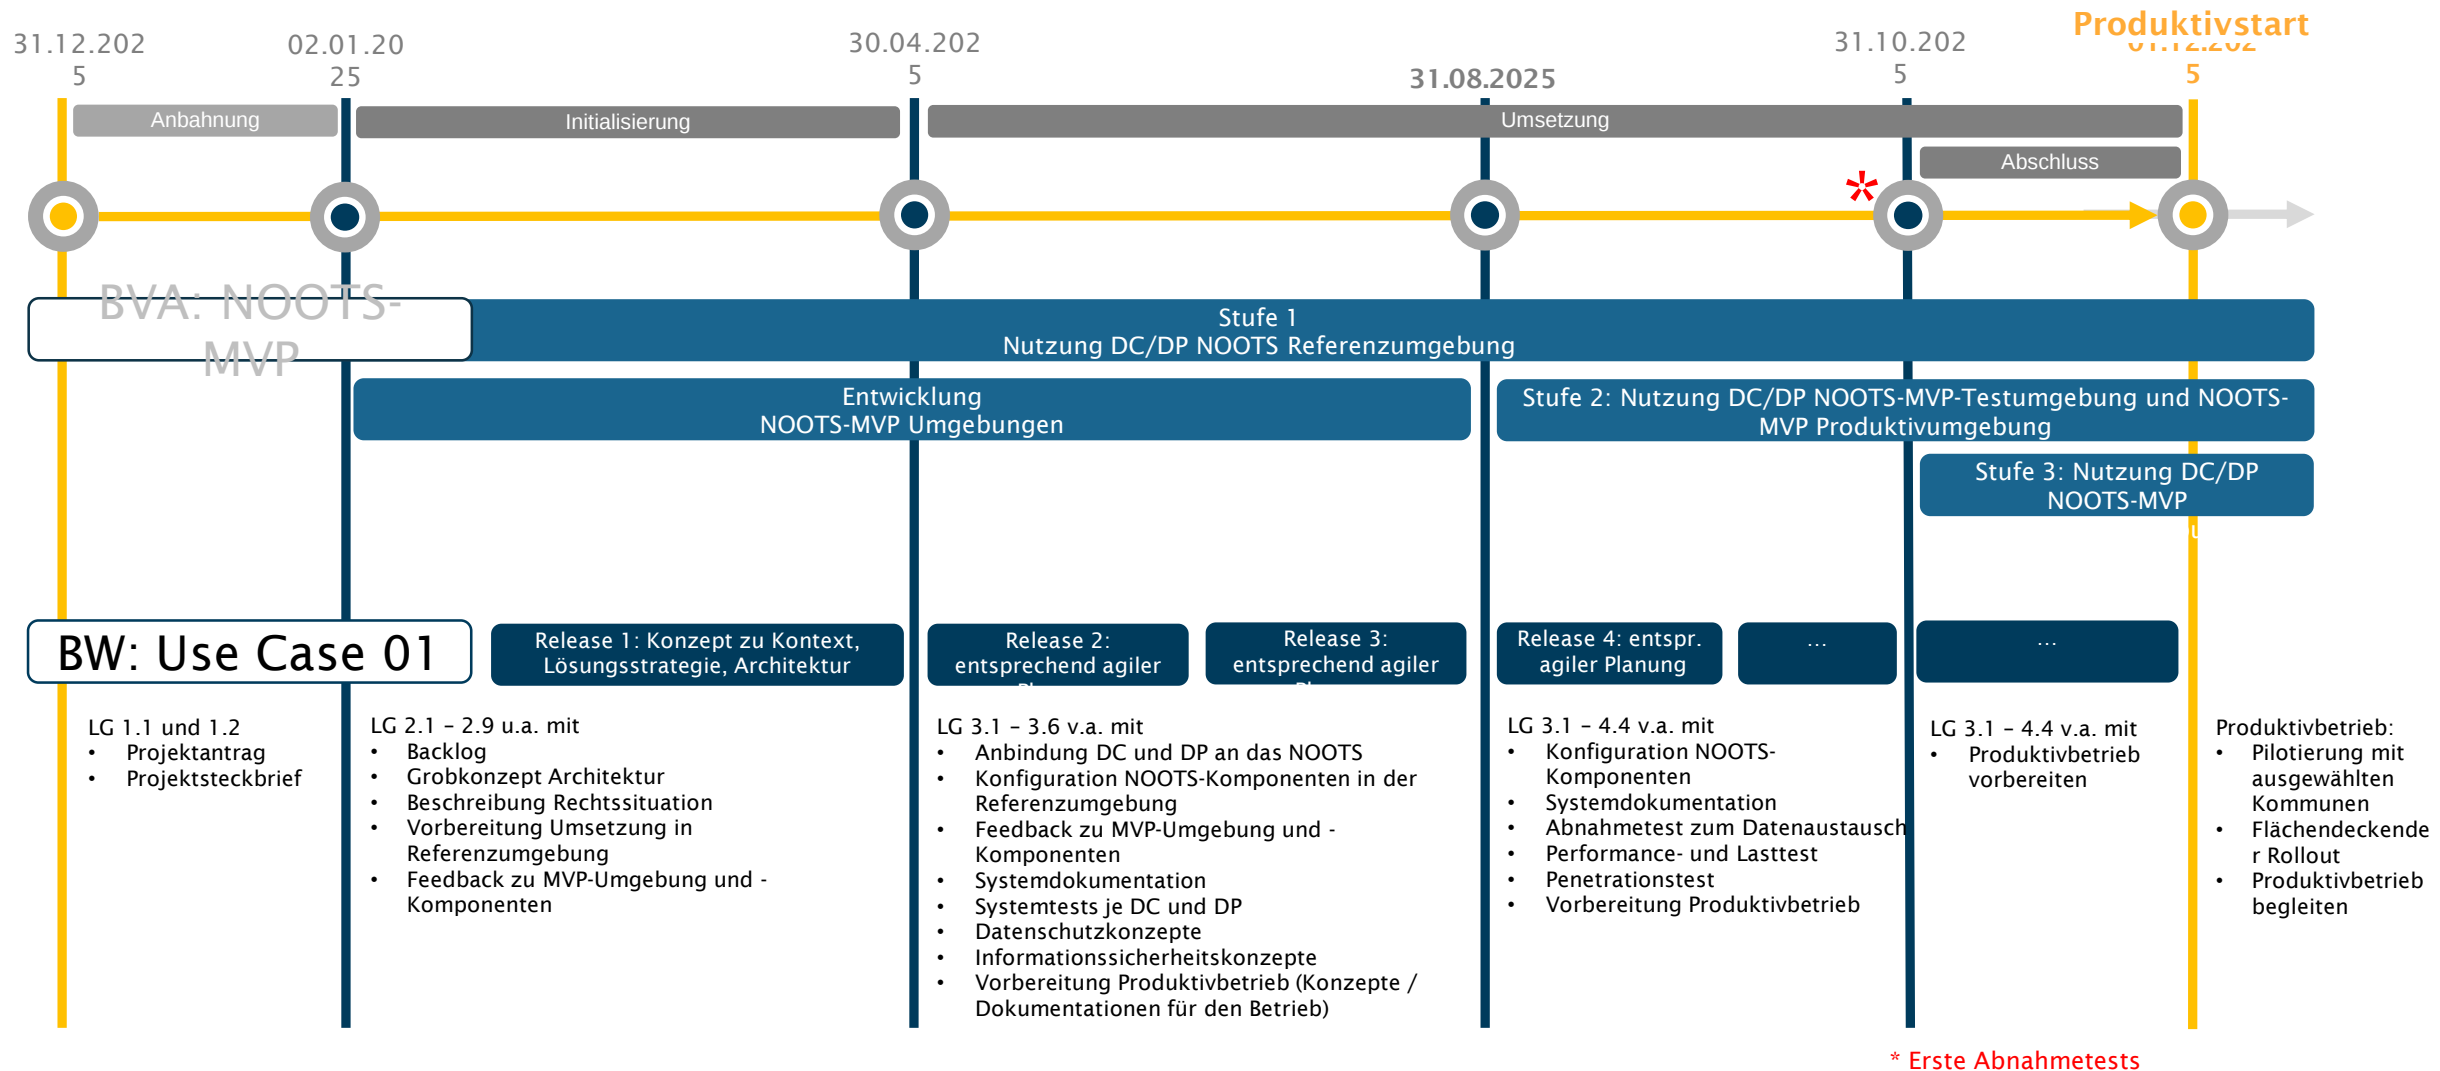

* Erste Abnahmetests


Fokus BW Use Case 01 (bürgerinitiiert) - Projektstrukturplan

NOOTS-MVP mit Use Case Bewohnerparkausweis / Zentrales Fahrzeugregister


Projektmanagement-Ergebnisse



Umsetzungs-Ergebnisse der NOOTS-Anbindung (Konzepte, Software, Dokumentation)

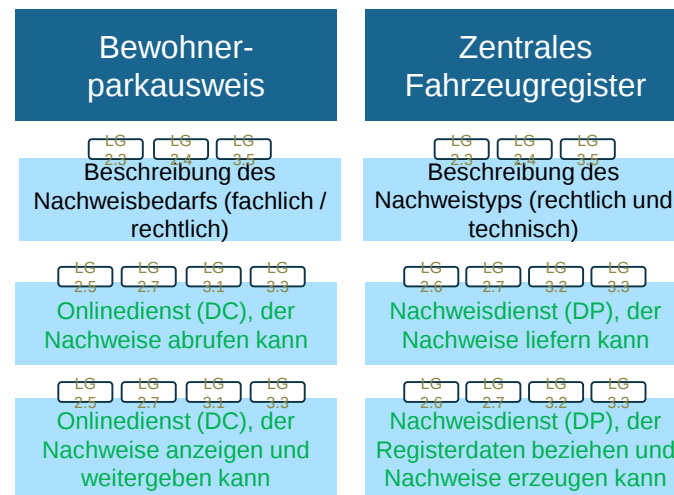

Ergebnisse für QS, Betrieb und Nachnutzung der NOOTS-Anbindung

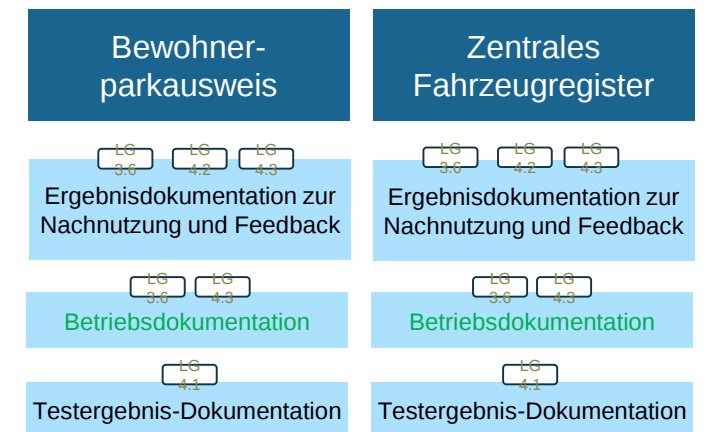

schwarze Schrift: Ergebnisse gem. Projektvorgehen für Umsetzungsprojekte

grüne Schrift: Ergebnisse über die Vorgaben des Projektvorgehens für Erprobungsprojekte hinaus oder Klärungspunkte

FF NW – Use Case 02 (unternehmensinitiiert)

- Phasen & Umsetzungsplan
- Projektstrukturplan

Umsetzungsplan

Datum	Phase / Meilenstein	Beschreibung / Aufgaben
31.12.202	Anbahnung	LG 1.1 und 1.2 • Projektantrag • Projektsteckbrief
31.01.202	Initialisierung	Release 1: Konzept zu Kontext, Lösungsstrategie, Architektur LG 2.1 – 2.11 mit • Projektpläne Folgephasen • Abnahme- / Abbruchkriterien • Projektbeschreibung • Beschreibung Datenbestand (Handelsregister) • Beschreibung aktuelle Rechtssituation • Fachkonzeption zur Anbindung NW DC und Handelsregister • Fachkonzeption Datenaustausch • Beschreibung Zusammenarbeit FachMK • Beschreibung Stakeholderlandschaft • Testkonzept
30.04.202	Entwicklung NOOTS-MVP Umgebungen	Release 2: entsprechend agiler Planung Release 3: entsprechend agiler Planung LG 3.1 – 3.8 mit • Entwicklung DPA • Entwicklung DCA • Feinkonzeption & Anbindung NW DC • Feinkonzeption & Anbindung Handelsregister • Feinkonzeption & Validierung Datenaustausch
31.08.2025	Umsetzung	Stufe 2: Nutzung DC/DP NOOTS-MVP-Testumgebung und NOOTS-MVP Produktivumgebung Release 4: entspr. agiler Planung ... • Vorbereitung Produktivbetrieb • Produktive Anbindung NW DC & DP an das NOOTS • Aktualisierung Registerlandkarte und Fachdatenkonzept • Beschreibung Anpassungsbedarfe Fachrecht • Initiale Erstellung Ergebnisdokumentation
31.10.202	Abschluss	Stufe 3: Nutzung DC/DP NOOTS-MVP Produktivumgebung ... LG 4.1 – 4.4 mit • Erstellung Testdokumentation • Erstellung Feedbackdokumentation • Erstellung Ergebnisdokumentation • Erstellung Projektabschlussdokumentation • Produktion
31.12.202	Produktivstart	Produktivbetrieb: • Flächen-deckender Rollout

NW: Use Case 02

BVA: NOOTS-MVP

Stufe 1: Nutzung DC/DP NOOTS Referenzumgebung

Stufe 2: Nutzung DC/DP NOOTS-MVP-Testumgebung und NOOTS-MVP Produktivumgebung

Stufe 3: Nutzung DC/DP NOOTS-MVP Produktivumgebung

IT-PLANUNGSRAT

Fokus NW Use Case 02 (unternehmensinitiiert) - Projektstrukturplan

NOOTS-MVP mit NOOTS UC 02_2025
Gewerbeanmeldung / Handelsregister

